

**Declaración del Trabajo**  
**< Proyecto de Rehabilitación de Redes**  
**Financiamiento BEI**  
**LOTE 06**  
**Circuitos NAGU101>**

**<EDENORTE Dominicana>**  
**<Dirección de Proyectos Financiados>**  
**<06/03/2018>**

## **1. Antecedentes**

La Empresa EDENORTE DOMINICANA, S.A. atendiendo a la estrategia nacional de desarrollo ha formulado una cartera de proyectos que tienen como objetivo principal la Rehabilitación de las Redes Eléctricas de los Barrios y Sectores donde existe un alto nivel de pérdidas, modernización de los sistemas de medición, incluyendo la regularización de los clientes y/o usuarios que residen en ellos, con miras a obtener una mejoría en la entrega y facturación de la energía que se les suministra y dificultar la comisión de acciones fraudulentas que lesionen la eficiencia en el suministro de dicho servicio. Con la puesta en marcha de estos proyectos la empresa estará impactando en los principales indicadores de desempeño de la misma, buscando una disminución en las pérdidas técnicas y no técnicas, aumentar el porcentaje de cobro de energía, así como también aumentar el índice de recuperación de efectivo (CRI); tales indicadores están alineados directamente con los objetivos estratégicos y correspondientes planes operativos de la empresa.

Con la ejecución de este proyecto el área de influencia será beneficiada con un mayor índice de disponibilidad del servicio (ASAI), mejor calidad en atención al servicio al cliente, mejora de la seguridad ciudadana mediante el alumbrado público, así como también reducción de averías; variables que contribuyen directamente con el desarrollo socioeconómico de los sectores intervenidos. En ese contexto EDENORTE dominicana, para garantizar el éxito del proyecto ha decidido conformar una dirección especializada para la gestión y supervisión de los mencionados proyectos, los cuales se desarrollan a partir de seis grandes componentes:

- a) **Componente de Obras:** Este componente a grandes rasgos tiene por objeto la rehabilitación de las redes de media tensión (MT) y baja tensión (BT), instalación de macro medición en MT, micro medición en secundario de transformadores, instalación de transformadores de distribución y la normalización de suministros.
- b) **Componente Comercial y Disciplina del Mercado:** Este componente tiene por objeto garantizar y mantener la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, a través del reforzamiento de las acciones propias del ciclo comercial de la empresa.
- c) **Componente Gestión Social:** Este componente busca integrar las comunidades para que formen parte del proyecto, a través de la participación y representación de las organizaciones comunitarias y los usuarios en general de la zona a intervenir. Para esto los equipos de gestión social de la empresa iniciarán este acercamiento tres (3) meses antes del inicio de obras, permanecerán durante toda la ejecución proyecto, y continuarán por tres (3) meses después de concluidas las obras. Entre las principales actividades a desarrollar de este programa están la identificación de los diferentes líderes de la comunidad e integración de los mismos a los procesos de

gestión social que se desarrollan sobre las comunidades de los proyectos, la sensibilización puerta a puerta a cada uno de los clientes a intervenir, así como también charlas sobre la importancia y beneficios del proyecto para las comunidades a intervenir. Con esto se garantiza que el contratista pueda desarrollar su plan de trabajo sin contratiempos, lo cual coadyuva al éxito del proyecto.

- d) **Componente Gestión Ambiental:** Tiene como objetivo garantizar la ejecución del proyecto bajo las normas de cuidado y protección del medio ambiente, tomando en cuenta todos los impactos negativos que puedan incidir en el proyecto y mitigarlos.
- e) **Componente Administración, Monitoreo y Evaluación:** Este componente tiene por objeto garantizar que las obras sean ejecutadas con los estándares de calidad exigidos en el plan de administración, así como también en el tiempo establecido. Este componente será ejecutado a través de supervisión y auditorías mixtas entre la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) de la CDEEE, EDENORTE y firmas externas.
- f) **Componente de comunicación al Público:** Su objetivo es proyectar al Programa de Rehabilitación de Redes como iniciativa de desarrollo referente en el sector eléctrico y en el país, así como también informar sobre las acciones y sus avances a través de distintos medios de comunicación.

## **2. Alcance del Trabajo**

El alcance del proyecto de rehabilitación de redes y normalización de suministros de los circuitos **NAGU101** incluye la adquisición, almacenamiento, ensayo, transporte, instalación (incluye obras civiles), y puesta en servicio de los materiales para la ejecución de 83 km de redes de distribución en MT, 85 km de redes en BT, alumbrado público, instalación de macro y micro medición, disposición de las acometidas y demás elementos para la medición de energía, de 7,450 suministros, de acuerdo a lo establecido en los diseños y especificaciones de ingeniería que serán proporcionados por EDENORTE.

Adicionalmente, el adjudicatario gestionará la adquisición, prueba, desaduanización y transporte, hasta los almacenes de EDENORTE, de una cantidad de materiales para mantenimiento, especificados por separado en la licitación.

Se ha planificado la ejecución de las obras de este proyecto, en Siete (7) polígonos/ etapas, que deben ser ejecutadas y concluidas de manera secuencial en el orden establecido por EDENORTE y plasmado en el cronograma de construcción.

El contratista deberá someter y apegarse a un Plan de Seguridad sometido ante Ministerio de Trabajo de la Rep. Dom. En adición, deberá seguir el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la norma para construcción de redes de distribución suministrados por CDEEE y normas específicas de las distribuidoras, los cuales serán entregados conjuntamente con los pliegos de licitación. Además, el proyecto estará sujeto a auditorías externas e internas, para lo cual el contratista dará acceso a sus instalaciones y presentará toda la información requerida para estos fines.

### **3. Periodo de Ejecución**

El tiempo máximo establecido para la ejecución de los trabajos adjudicados al contratista es de 13 meses calendarios, contados a partir de la recepción del anticipo por parte del contratista y la fecha de la minuta en que queden definidas y aprobadas las cantidades de los materiales que será comprados. Así mismo EDENORTE dominicana establece que el tiempo mínimo de recepción de la obra no podrá ser menor a 10 meses. Dentro del periodo de ejecución antes mencionado, el contratista tendrá un plazo máximo de cuatro (4) meses para la adquisición de todos los materiales, los cuales serán contados a partir del momento en que EDENORTE emite la autorización de compra de materiales, luego de lo cual se dará la autorización para iniciar los trabajos en terreno. Cualquier propuesta de modificación o prórroga de los tiempos de entrega establecidos, deberán contar con la autorización formal del Director del Proyectos de EDENORTE y la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) de la CDEEE.

El contratista dispondrá de 40 horas de interrupciones del suministro eléctrico a la semana, para la ejecución de las obras bajo su responsabilidad de lunes a sábado; siempre que no afecte la operación del sistema eléctrico nacional. Las interrupciones antes mencionadas deberán ser coordinadas con una (1) semana de anticipación. Edenorte se reserva el derecho de gestionar las interrupciones de manera seccionada en los circuitos siempre que sea necesario, salvaguardando la disponibilidad de servicio y abastecimiento de la demanda de los clientes que ya cuentan con un servicio 24 horas. Los criterios para programar dichas interrupciones serán conciliados con el encargado de obras y de normalización respectivamente.

El contratista deberá entregar los planos finales (AS-BUILT), cuadro de materiales (instalados y retirado) y la última cubicación de obra ejecutada; en un plazo máximo de un (1) mes después de culminados los trabajos y emitida la recepción definitiva de obras bajo su responsabilidad.

#### **4. Lugar de Ejecución**

El emplazamiento para la ejecución de esta obra corresponde a todo el casco urbano del pueblo de Nagua de la provincia María Trinidad Sanchez de República Dominicana, las cuales son alimentadas por los Circuito **NAGU101** de la sub estación de Nagua. Las áreas de ejecución de las obras serán detalladas en los planos geográficos de localización dentro de los planos de obras de ingeniería.

La empresa CDEEE y EDENORTE coordinarán una visita técnica, para los oferentes, al lugar donde serán ejecutadas las obras a fin de verificar cualquier detalle relevante.

El contratista deberá disponer de un almacén para los materiales de este proyecto, localizado dentro del área de concesión de EDENORTE. Todos los materiales y recursos logísticos para la construcción de la obra serán resguardados en el almacén del contratista. Del mismo modo el contratista resguardará en su almacén los materiales y escombros producto de las remociones propias del proyecto para su clasificado y cuantificación, posteriormente con una periodicidad mensual/quincenal, y/o, según lo requiera la operativa, EDENORTE recibirá el material en uno de los almacenes que considere más apropiado. El contratista será responsable de la disposición final de los escombros y/o desperdicios resultantes de su trabajo.

Las reuniones de avance de las obras serán llevadas a cabo en las instalaciones de EDENORTE dominicana, en la Jardín Plaza, Av. 27 de febrero esquina Av. Padre Ramon Dubert, Santiago De Los Caballeros.

#### **5. Requerimientos del Trabajo**

Como garantía de la construcción de la obra de rehabilitación de redes del circuito **NAGU101** el contratista será responsable de la realización de tareas a lo largo de las tres (3) fases de este proyecto. La siguiente es una lista de las tareas requeridas al contratista, necesario para la ejecución exitosa del proyecto

##### **Fase inicial (antes de iniciar las obras):**

- El contratista deberá presentar a EDENORTE todos los recursos humanos, logísticos y de equipamiento, que comprometió en su oferta, cuyas cantidades mínimas están incluidas en el Anexo A, de este documento.

- El contratista deberá presentar un plan sistematizado para el control de calidad del proceso de construcción de infraestructura de redes y de normalización de suministros, el cual incluya entregables para la puesta en servicio de las instalaciones.
- El contratista deberá presentar un esquema de ejecución del proceso de normalización que garantice la correcta instalación de acometidas, rotulación de borneras, normalización de suministros, certificación de totalizadores, certificación de gabinetes. Edenorte le proporcionará los procedimientos básicos de supervisión que le ayudaran en su organización y definición del su plan.
- El contratista designará un encargado, el cual acompañará al supervisor de EDENORTE con quien realizará el replanteo de los diseños, para la ejecución de las obras.
- El contratista será responsable de la actualización de los planos de ingeniería y listados de materiales y mano de obra posterior al replanteo.
- El contratista presentará a EDENORTE el cronograma completo (vinculando tiempo y recursos), preferible en MS Project, de todas las actividades bajo su responsabilidad para su revisión y aprobación, después de replanteo.
- El contratista deberá disponer de un almacén de 1,739 Metros cuadrados, adecuado para resguardar todos los materiales de la obra, dentro del área de concesión de EDENORTE, que será de uso exclusivo para este proyecto. Ver dimensiones detalladas en Anexo numeral 5.
- El contratista dispondrá de cuatro (4) meses para los trámites de compra, transporte y desaduanización de los materiales requeridos para el proyecto, proceso sobre el cual deberá mantener informado a EDENORTE.
- El contratista deberá entregar constancia del proceso de adquisición de materiales, el cual certifique que la cantidad de materiales contratados para la obra ha sido adquirida.
- El contratista deberá disponer de un software para el control de stock de materiales con la facilidad de acceso vía web para EDENORTE y la firma fiscalizadora del proyecto, el mismo servirá de soporte para seguimiento y control del inventario de los materiales durante la ejecución de su trabajo.
- El contratista será responsable de realizar en sus instalaciones y/o coordinar con los suplidores todas las pruebas concernientes a la aceptación y recepción técnica de los materiales, entregando a EDENORTE los informes de resultados, según lo establece las especificaciones técnicas de los mismos, mientras que el personal de EDENORTE será únicamente responsable de la supervisión de las pruebas y aceptación de dichos materiales.
- Con anticipación al inicio de las obras el contratista y todo su personal administrativo y operativo, deberán participar en una reunión de formalización y arranque del proyecto, en donde se presentará el plan de administración del proyecto y al equipo responsable del mismo.
- Antes de iniciar con los trabajos de normalización el contratista deberá solicitar con 2 semanas de antelación la capacitación de su personal de al menos el 75% que

participará en el proceso. El personal deberá contar con las competencias exigidas según la actividad a desempeñar, además de aprobar la evaluación que será impartida concluida la capacitación. La logística y organización del proceso de capacitación y sus implicaciones será responsabilidad del contratista.

- Antes de iniciar los trabajos contratados el contratista deberá entregar copia a EDENORTE constancia de sometimiento o aprobación del Plan de Seguridad Laboral ante el Ministerio de Trabajo de Rep. Dom.
- Previo al inicio de las obras el contratista deberá presentar un plan de acción para manejo ambiental según los lineamientos establecidos en la guía ambiental incluida en los documentos de licitación.
- El contratista deberá presentar constancia a EDENORTE de que todo su personal está debidamente registrado ante las instancias de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la Rep. Dom.

#### **Fase de Construcción:**

- El contratista resguardará, transportará e instalará el material nuevo adquirido para sus trabajos; planificando, coordinando y supervisando todas las actividades requeridas para la buena culminación de los trabajos.
- El contratista realizará la construcción de las redes de MT y BT, de acuerdo a los planos y diseños de ingeniería suministrados actualizados durante el proceso de replanteo. Cualquier cambio propuesto durante el proceso de ejecución de obra debe ser previamente aprobado por Edenorte.
- El contratista dará acceso a sus instalaciones al personal de EDENORTE, al momento que se requiera, para fines inspección, verificación o auditorías del stock de materiales.
- Las principales actividades a realizar por el contratista en este proyecto corresponden a:
  - i) Izado de 2,632 postes de hormigón con sus respectivas estructuras de acuerdo al diseño especificado en las fichas técnicas.
  - ii) Construcción de 83 Km de red de media tensión de acuerdo al diseño presentado en las fichas técnicas.
  - iii) Construcción de 85 Km de red de baja tensión para la distribución de energía eléctrica a los clientes de acuerdo al diseño de red presentado.
  - iv) Instalación de 2,466 luminarias de alumbrado público.
  - v) Instalación de 320 transformadores de distribución para la alimentación de los clientes comprendidos en el área de influencia por etapas.

6 de marzo de 2018

- vi) Instalación de 7,450 acometida y respectivos medidores para la normalización de los suministros a los clientes comprendidos en el área de influencia por etapas.
  - vii) Instalación de 100 gabinetes
  - viii) Instalación de 941 display
  - ix) Rotulación/etiquetado de 7,450 acometidas para la identificación del número de suministro de cada cliente, en el área de influencia por etapas.
  - x) Instalación de 320 Micro medición en las redes de BT.
  - xi) Instalación de 9 macro mediciones como seccionamiento de las redes de MT.
  - xii) Remoción de las redes de distribución existentes.
  - xiii) Recomposición del espacio público (aceras y contenes)
  - xiv) Prueba de la puesta en servicio de toda la red del área de concesión del proyecto y sus respectivos equipos de protección.
  - xv) Elaboración de los planos finales (AS-BUILT) en acuerdo con el personal designado por EDENORTE.
- El contratista coordinará con la supervisión de EDENORTE para la apertura de circuitos, interconexión y puesta en servicio de segmento de redes y transformadores, entrega de trabajos realizados y cubicaciones.
  - El contratista coordinará con la empresa de alcantarillado y agua potable la solución de cualquier avería provocada por las excavaciones.
  - El contratista instalará la micro medición (totalizadores BT) conjuntamente a la instalación de los transformadores.
  - El contratista instalará las etiquetas conjuntamente con los transformadores.
  - Para la ubicar los transformadores, el mismo debe estar energizado y conectado a la red de baja tensión.
  - El contratista deberá entregar los medidores para calibración al Laboratorio de Medidas de EDENORTE 30 días previos al inicio del proceso de instalación, luego de lo cual deberá transportarlos nuevamente a su almacén para fines de resguardo hasta su instalación.
  - Cuando la cantidad de medidores exceda las 3,000 unidades para la determinación del tiempo de antelación en la entrega se aplicará siguiente fórmula:
$$\text{Días de antelación} = (\text{cantidad de medidores} * 20) / 2000$$
  - Los medidores deberán ser trasladados por el contratista al laboratorio de medida dispuesto por EDENORTE DOMINICANA S.A., para que estos sean calibrados, sellados y dispuestos para la operativa del proyecto.
  - Los medidores deberán venir en paletas, embalados en cajas donde se indique la siguiente información: Tipo de medidor, Cantidad, N° de series que incluye cada caja.



- Dentro de cada caja de embalaje deberá contener el listado de los medidores con sus resultados de la calibración en fábrica, el cual también deberá ser proporcionado por el contratista de manera digital antes de la entrega de los equipos.
- El contratista previo al inicio del proceso de normalización el contratista deberá entregar los sellos de seguridad, con 30 días de antelación.
- El contratista coordinará con EDENORTE antes de efectuar la remoción de la red existente de MT y BT. Se debe hacer un recorrido previo para levantar los materiales a remover.
- El contratista coleccionará y transportará hasta su disposición final todos los escombros y desperdicios producto de su actividad. El lugar de disposición final debe ser aprobado por EDENORTE.
- El contratista deberá desmontar todos los elementos de la red existente procurando su posible reutilización y evitando daños innecesarios a los mismos, en procura de una posible reutilización autorizada por EDENORTE.
- El contratista deberá resguardar, clasificar, transportar y devolver a los almacenes de EDENORTE todo el material retirado. El esquema de remoción deberá apegarse a lo establecido en las prescripciones de ingeniería, así como también a la norma interna de remoción de materiales.
- El contratista Generará informes semanales de seguimiento y avance de obra.
- El contratista utilizará señalización de seguridad, en todo momento, en su zona de trabajo.
- El contratista deberá mantener todo el personal bajo su responsabilidad debidamente identificado, con un uniforme único y equipos de protección persona (EPP); acorde con las normativas de seguridad establecidas por EDENORTE.
- En caso de ser necesario El contratista deberá rotear las acometidas de manera que estas cumplan con lo establecido en la norma de instalación de baja tensión. El roteo es considerado como parte de la instalación de las acometidas y solo se reconocerá como un esfuerzo adicional en los callejones que vayan por un cable guía dada su longitud.
- El contratista será responsable de ejecutar, a su propio costo, las correcciones a los trabajos realizados fuera de norma o que hayan presentado fallas atribuibles a una mala instalación o por deterioro del material por manejo inadecuado durante el almacenamiento y transporte o por baja calidad del material suministrado.
- El contratista deberá completar diariamente una bitácora de avance y eventos de obra. Además, completará cualquier otra planilla que requiera EDENORTE para captura de información sobre los trabajos realizados.
- El contratista deberá llenar todas las planillas y controles que sean requeridos en el proceso de normalización, sea manual o por algún medio digital.

- El contratista debe realizar la toma de lectura de los medidores retirados, en caso que los mismos tengan la batería averiada, deberán utilizar el inversor para energizarlos.
- El contratista concentrará sus recursos en el polígono que corresponda según el cronograma acordado con EDENORTE, y culminará su labor en dicho polígono cuando todos los suministros del mismo estén normalizados, completado el proceso de remoción y reciba la aprobación formal de EDENORTE.
- Las facturaciones serán recibidas al contratista para fines de cubicación y validación con una periodicidad mensual.
- Cualquier cambio requerido por el contratista deberá ser dirigido de forma escrita al director del proyecto de EDENORTE.
- El contratista deberá ejecutar sus tareas respetando el Plan de Seguridad Laboral aprobado por el Ministerio de Trabajo de la Rep. Dom y el Plan de Manejo Ambiental y Seguridad suministrado por EDENORTE.
- El contratista debe cumplir con todos los procedimientos, instructivos y normas del sistema de gestión ambiental proyectos SGA proporcionado por EDENORTE.
- Los conductores para MT y BT deben ser instalado con poleas de deslizamiento en cada punto de apoyo definitivo y ser tensado de acuerdo a su temperatura y su sección, acorde la tabla de templado disponible.
- Los trabajos en altura se deberán ejecutar con escalera, escalera en plataforma o canasto.
- El contratista debe utilizar las herramientas adecuadas para cada actividad, especialmente para la realización de los empalmes de conductores.
- El levantamiento de postes, cajas multi-medidor, transformadores de medición y transformadores de potencia deben realizarse con las slings correspondientes, en ningún caso se permitirá el uso de cadenas para esta actividad.
- El contratista, a requerimiento aleatorio de EDENORTE, tomará muestras del hormigón para cimentación, con el objeto de realizar pruebas de resistencia.
- El contratista estará obligado a participar de las reuniones de avance de obras y operativas según sea el requerimiento de Edenorte.
- El contratista realizara la instalación de las acometidas con el rendimiento y configuración operativa definido que le permita que cliente quede de forma inmediata energizado por las redes nuevas, que sea normalizado y que la acometida antigua sea removida simultáneamente. Luego de haberse completado la zona de influencia del transformador antiguo, las redes deberán ser removidas, lo cual no podrá ser postergado, salvo se haya coordinado con Edenorte.
- El contratista debe disponer de la brigada de normalización para la atención de los suministros que vayan quedando detrás de la operativa.
- Las acciones de nuevas instalaciones dentro de la zona de concesión del proyecto

durante el desarrollo del mismo serán clasificadas por el Supervisor de Edenorte, para que el Contratista las realice en una hora acordada, en un plazo máximo para la atención es de 24 horas.

- En los casos de instalación de acometidas en sistema de medición concentrada en altura (gabinetes en altura) el contratista deberá realizar la instalación de un toma corriente, la conexión y fijación del Display. Deberá llenar la solicitud de ingreso a la vivienda y el control de liquidación de los materiales utilizados. Esta actividad debe ser realizada por la brigada de normalización.
- Edenorte estará evaluando el desempeño del contratista y calidad de la ejecución de los trabajos de normalización y obra mediante un esquema previamente socializado y acordado.

#### **Fase de Cierre del Proyecto:**

- El contratista proporcionará al administrador del proyecto toda la documentación de acuerdo con el plan del proyecto aprobado, mediante la entrega definitiva de trabajos y planos digitalizados "AS-BUILT" (Como Construido).
- El contratista notificará por escrito la conclusión de los trabajos.
- El contratista participará junto a EDENORTE en la verificación en terreno de los trabajos finalizados y recibirá una recepción provisional o definitiva, según corresponda.
- En caso de una recepción provisional, el contratista tendrá un plazo de 30 días para realizar las correcciones de lugar.
- El contratista será responsable de la elaboración del informe de cierre de obra, donde se realice la recepción definitiva de los trabajos por parte de la empresa distribuidora.

#### **6. Cronograma/Hitos**

A continuación, se presenta el listado de actividades/ hitos para garantizar la exitosa ejecución del proyecto **NAGU101** Las etapas serán acordadas con el contratista previo al inicio de la obra, las mismas estarán dimensionadas en función de la cantidad de postes a izar y clientes a normalizar.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Rehabilitación de Redes NAGU101	290 días	jue 1/11/18	mié 11/12/19
Periodo de Adquisiciones	80 días	jue 1/11/18	mié 20/2/19
Ejecución	250 días	jue 29/11/18	mié 13/11/19
Polígono 1	127 días	jue 29/11/18	vie 24/5/19
Polígono 2	152 días	vie 21/12/18	lun 22/7/19
Polígono 3	151 días	jue 10/1/19	jue 8/8/19
Polígono 4	159 días	mié 30/1/19	lun 9/9/19
Polígono 5	148 días	jue 7/3/19	lun 30/9/19
Polígono 6	149 días	vie 29/3/19	mié 23/10/19
Polígono 7	145 días	jue 25/4/19	mié 13/11/19
Cierre de Obras	20 días	jue 14/11/19	mié 11/12/19

## **7. Criterios de Aceptación**

La aceptación final de los entregables de este proyecto será responsabilidad del director de proyectos de EDENORTE, luego de agotado todo el proceso de validación y la puesta en servicio de la infraestructura de red, sus elementos de control y normalización de la totalidad de suministros en el área de ejecución de la obra.

- La aceptación de la obra estará sujeta al cumplimiento de la Norma de construcción homologada por la CDEEE y los diseños y planos de ingeniería suministrados al contratista.
- Se realizarán recepciones provisionales por polígonos según las delimitaciones acordadas con el contratista antes del inicio de las obras.
- La aceptación de la obra será por polígonos según las delimitaciones acordadas con el contratista antes del inicio de las obras definidas.
- La obra será aceptada luego de haber probado y puesto en funcionamiento todos los elementos que la componen.
- La obra será aceptada con el informe de calidad en cual deberá contener las inspecciones realizadas del proceso de supervisión como resultado de la aplicación método de ejecución previamente coordinado.

- La obra será aceptada luego de que el contratista haya entregado los planos finales (AS-BUILT) a EDENORTE y la liquidación final de servicios ejecutados y bienes instalados en el proyecto.
- La obra será aceptada mediante un documento de aceptación firmado por el director del proyecto de EDENORTE.


## **8. Otros Requerimientos**

- Todos los materiales adquiridos deben contar con las garantías requeridas en las especificaciones y ser emitidas a favor de la CDEEE.
- El contratista debe contar con personal competente y con experiencia en la materia, según se indica en el Anexo A- Numeral 1
- Todo el personal propio o subcontratado deberá estar exento de temas pendientes con la justicia o antecedentes de acciones fraudulentas en el sector eléctrico. Además, deben demostrar que está al día con el pago de su servicio eléctrico.
- Dimensionamiento adecuado de la capacidad operativa para el cumplimiento del cronograma, según Anexo A Numeral 1 y 2.
- Apego única y exclusivamente a realizar los trabajos en el emplazamiento y horario establecido por EDENORTE.
- El personal de la empresa contratista deberá asistir a los entrenamientos que la EDENORTE disponga, relacionados con aspectos de seguridad, medio ambiente y procedimientos técnicos claves.
- El contratista debe abstenerse de emitir cualquier información sobre el proyecto y referir a cualquier interesado al personal de EDENORTE.
- El contratista deberá instruir a todo el personal a tratar las comunidades con respeto, cualquier conflicto o desacuerdo durante el desarrollo de las obras, deberá comunicarlo al supervisor de obras de EDENORTE.
- No está permitida la realización de trabajos particulares en las áreas de ejecución de obras por parte del personal propio o subcontratado por el adjudicatario.
- El contratista, debe conocer y cumplir con todos los procesos, procedimientos e instructivos del Sistema de gestión ambiental (SGA) de los proyectos.

## ANEXO A

### 1- Estructura y Personal

El siguiente diagrama muestra la estructura mínima que el adjudicatario debe conformar y presentar para la ejecución de las tareas bajo su responsabilidad. Esta es la estructura requerida para el adjudicatario de un sólo lote. Un adjudicatario con múltiples lotes deberá replicar la sección punteada de la estructura tantas veces como lotes haya ganado.

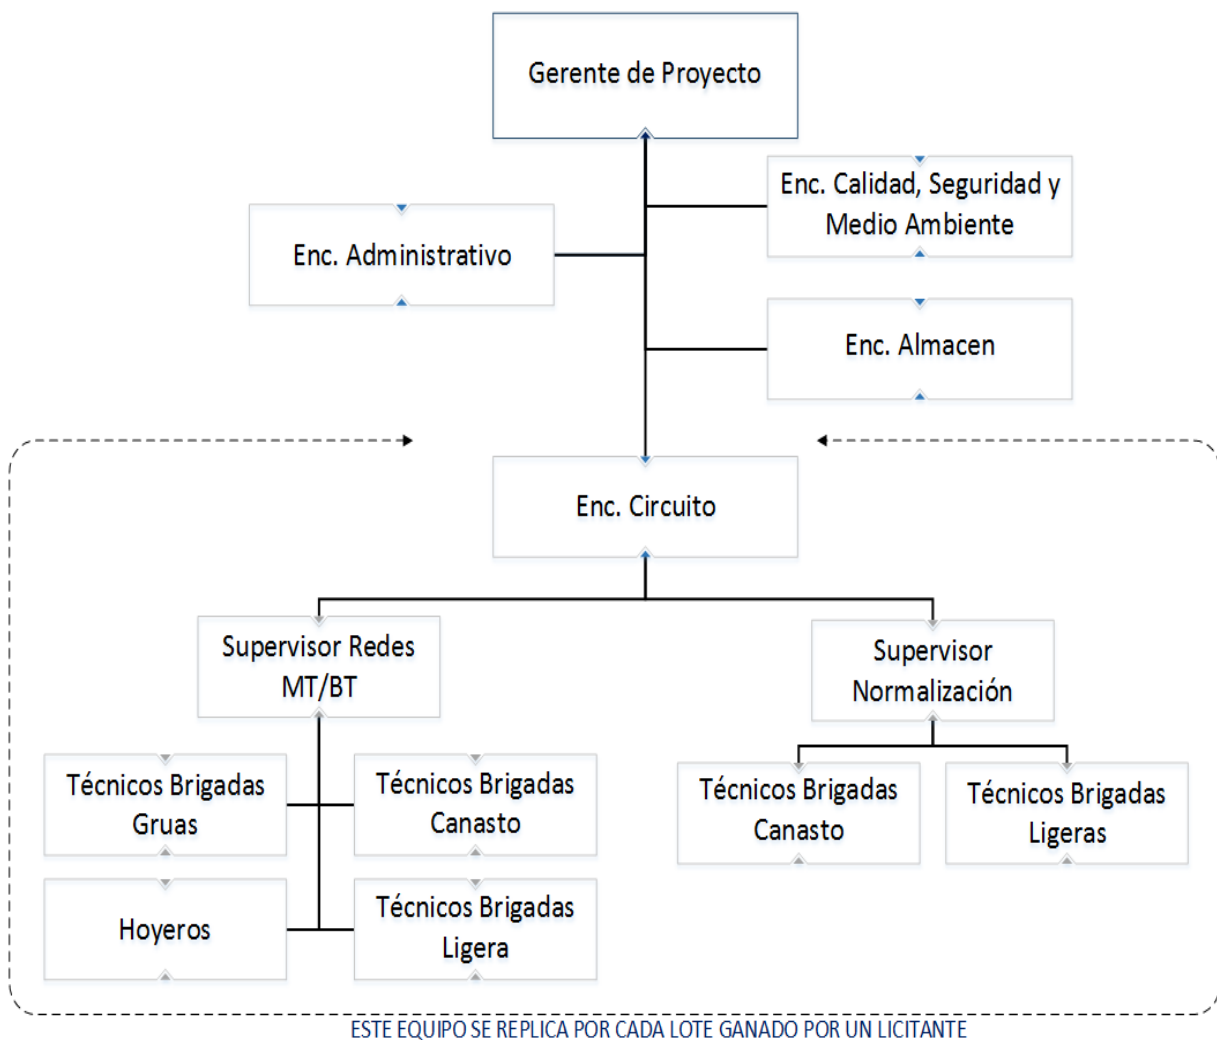

6 de marzo de 2018

Los oferentes deben presentar el currículo vitae del personal propuesto como Gerente de Proyecto, Encargado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Encargado de Circuito, Supervisor de Normalización, Técnico de Normalización y Ayudante de Normalización, conjuntamente deberán presentar la factura de energía eléctrica que acredite estar al día con la distribuidora de electricidad donde reside. El contratista deberá disponer de un supervisor de Normalización por cada frente de trabajo,

Además, deben completar la siguiente tabla con los datos del personal propuesto para las posiciones antes indicadas.

<b>Cargo</b>		
<b>Información personal</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha de nacimiento</b>
	<b>Nacionalidad</b>	
	<b>Calificaciones profesionales</b>	
<b>Empleo actual</b>	<b>Nombre del empleador</b>	
	<b>Tipo de empleo</b>	
	<b>Dirección del Empleador</b>	
	<b>Teléfono</b>	<b>Persona de contacto (gerente / oficial de personal)</b>
	<b>Fax</b>	<b>Dirección electrónica</b>
	<b>Cargo actual</b>	<b>Años con el empleador actual</b>

A continuación, una breve descripción del perfil de cada puesto y sus responsabilidades:

▪ **Gerente de Proyecto**

Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, con experiencia mínima de cinco (5) años en administración y manejo de contratos similares en cuanto a tamaño. Experiencia administrativa en la gestión de proyectos.

▪ **Encargado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente**

Profesional en el área de las ingenierías con especialidad en prevención de riesgo de seguridad, medio ambiente y control de calidad de procesos. Experiencia mínima de 2 años en trabajos en redes de MT y BT aérea y subterránea.

▪ **Encargado Administrativo**

Profesional, encargado del control, generación, presentación de informes, estados de avances, pagos, facturación, y en general responsable de todas las labores administrativas necesarias para la correcta operación del contrato. Experiencia mínima de 2 años en labores similares.

▪ **Encargado Almacén**

Profesional, encargado del control e inventario de los materiales y activos de la empresa y en tránsito. Capaz de la generación y presentación de informes, manejo de sistemas computacionales tales como planillas de cálculo, procesador de texto, bases de datos, etc. Experiencia mínima de 2 años en labores similares.

▪ **Encargado de Circuito**

Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, con experiencia mínima de cinco (5) años en supervisión de trabajos de construcción o mantenimiento de redes MT/BT.

Debe tener amplios conocimientos en:

- Programación de trabajos de construcción de redes MT y BT, con especial habilidad para asignar recursos técnicos y humanos.
- Interpretación de planos y ejecución de obras relacionadas con trabajos de construcción de redes MT y BT, obras civiles y eléctricas.
- Conocimientos de trabajo en actividades cercanas a líneas energizadas, en que es preciso adoptar procedimientos seguros, siguiendo las normas de prevención



que rigen estos trabajos y mantener las distancias eléctricas reglamentarias permitidas.

- Conocimientos acabados en operación de redes en servicio.
- Programación de trabajos de normalización de suministros, con especial habilidad para asignar recursos técnicos y humanos, además de reconocer rutas críticas en la ejecución de los trabajos.
- Interpretación de planos y ejecución de obras relacionadas a la normalización de suministros, instalación de medidores, entre otros.
- Cubicación de materiales y estructuras asociadas a obras civiles y eléctricas.
- Manejo de Personal y buenas relaciones humanas.

▪ **Supervisores Redes MT/BT**

Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, con experiencia mínima de tres (3) años en trabajos de construcción o mantenimiento eléctrico de redes aéreas y subterráneas MT y BT. Debe tener amplios conocimientos en:

- Programación de trabajos de construcción de redes MT y BT, con especial habilidad para asignar recursos técnicos y humanos.
- Interpretación de planos y ejecución de obras relacionadas con trabajos de construcción de redes MT y BT, obras civiles y eléctricas.
- Conocimientos de trabajo en actividades cercanas a líneas energizadas, en que es preciso adoptar procedimientos seguros, siguiendo las normas de prevención que rigen estos trabajos y mantener las distancias eléctricas reglamentarias permitidas.
- Conocimientos acabados en operación de redes en servicio.
- Cubicación de materiales y estructuras asociadas a obras civiles y eléctricas.
- Manejo de Personal y buenas relaciones humanas.

▪ **Supervisores de Normalización de Suministros**

Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, con experiencia mínima de tres (3) años en supervisión y ejecución de trabajos de normalización de suministros, campañas de instalación de medidores, inspección de brigadas, entre otros, debiendo tener amplios conocimientos en:

- Programación de trabajos de normalización de suministros, con especial habilidad para asignar recursos técnicos y humanos, además de reconocer rutas críticas en la ejecución de los trabajos.

6 de marzo de 2018

- Interpretación de planos y ejecución de obras relacionadas a la normalización de suministros, instalación de medidores, entre otros.
- Cubicación de materiales y estructuras asociadas a obras civiles y eléctricas.
- Manejo de Personal y buenas relaciones humanas.

▪ **Técnico de Normalización de Suministros**

Técnico eléctrico o estudiante de ingeniería eléctrica, eléctrica, industrial, sistemas, con experiencia mínima de uno (1) año en trabajos de normalización de suministros, campañas de instalación de medidores, inspección de brigadas, entre otros.

▪ **Ayudante de Normalización de Suministros**

Técnico o perito eléctrico.

## 2- Brigadas por Lote

La infraestructura básica sugerida para el circuito será la siguiente:

Recursos NAGU101	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13
Canasto Redes				4	8	8	8	6	14	14	12	8	6
Brigada Ligera Redes		2	2	4	4	4	2	4	4	6	6	2	2
Grúa	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2	4	6	6
Frente Normalización						3	3	3	3	3	3	3	0

- Composición de brigadas para trabajos de redes (MT/BT):

Tipo de Brigada	Capataz	Liniero I	Liniero II	Total Personal
Grúa	1	1	1	3
Canasto	1	1	1	3
Ligera	1	1	1	3

6 de marzo de 2018

- Composición de brigadas para trabajos de poda:

Composición brigadas Poda Propuesto				
Tipo de Brigada	Capataz	Operador Motosierra	Podador	Total Personal
Poda	1	2	4	7

- Composición de brigadas para trabajos de normalización de suministros (BT):

Encargado Frente de Normalizacion	1
-----------------------------------	---

Tipo de Brigada	Capataz Acometida	Liniero	Tecnico	Ayudante	Total
Brigada Canasto	1	1	2	3	7

Tipo de Brigada	Ayudante	Total
Inst. Base, Puesta Tierra, Caños	4	4

Tipo de Brigada	Chofer	Tecnico	Total
Instalacion Micromedición	1	1	2

Tipo de Brigada	Supervisor Brigada	Tecnico	Ayudante	Total
Brigada Ligera (Mixta)	1	1	1	3
Brigada Ligera (Mixta)		1	1	2

### 3- Herramientas y Equipos Requeridas

Los equipos y herramientas básicas requeridas por tipo de brigada, son los siguientes:

- **Herramientas y Equipos para un frente de trabajo de Brigadas de Redes (MT/BT)**

Herramientas brigadas Redes propuesta consensuada por brigada								
ID	Descripción	Cantidad Total	Grúa 10-12 Ton.	Grúa para TR 5 - 7 Ton.	Canasto MT - BT	Ligera (Camión cama lisa)	Hoyeros	Poda
1	Alicate de corte oblicuo con mango aislado 1000 V de 10 pulgadas.	4	1	1	1	1		
2	Amperímetro	2			1	1		
3	Marco de segueta.	2			1	1		
4	Cinzel.	3			1	1	1	
5	Cizalla de Corte 36" con Mango Aislado 1000V.	2			1	1		
6	Cuchilla pela cable con mango aislado 1000V.	2			1	1		
7	Cuñas separadoras de fases para cable triplex de material plástico.	2			1	1		
8	Detector de tensión rango 2 a 35 kV.	5	1	1	1	1		1
9	Empalmador hidráulico Y 35.	2			1	1		
10	Pistola para conectores tipo Cuña	2			1	1		
11	Escalera extensión 32 pies fibra vidrio	4	1	1	1			1
12	Juego de llaves combinadas.	2			1	1		
13	Juego Destornilladores punta estriada con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).	1				1		

6 de marzo de 2018

14	Juego Destornilladores punta plana con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).	1				1		
15	Guantes aislados MT Clase 2 ( 17Kv)	5	1	1	1	1		1
16	Equipo de Puesta a Tierra con p�rtiga >20 KA.	5	1	1	1	1		1
17	Vara telesc�pica aislada 20kv 35`	5	1	1	1	1		1
18	Llave ajustable (francesa) con mango aislado 1000V de 10 pulgadas.	2			1	1		
19	Llave chicharra (cr�quet).	2			1	1		
20	Machete.	7			1			6
21	Malacate de cadena de 3 Tonelada (Diferencial).	2			1	1		
22	Maquina flejadora.	2			1	1		
23	Martillo de bola de 2 libras.	2			1	1		
24	Mechas p/ taladro.	1			1			
25	Pinza pico de cotorra con mango aislado 1000V de 12 pulgadas.	2			1	1		
26	Pinza universal con mango aislado 1000V de 10 pulgadas.	2			1	1		
27	Prensa de compresi�n MD6	2			1	1		
28	Kit anti derrames	6	1	1	1	1	1	1
29	Rana 2/0.	2			1	1		
30	Rana 4/0.	2			1	1		
31	Rana 477/465.	2			1	1		
32	Motosierra	2						2
33	Podadora de altura	2						2
34	Soga o cuerda de trabajo (45 pies).	6	1	1	1	1		2
35	Arn�s de Seguridad con sistema anti ca�das	10	1	1	1	1		6
36	Cuerda de vida.	10	1	1	1	1		6
37	Spot light.	5	1	1	1	1		1
38	Guantes de seguridad anti cortes	6						6

6 de marzo de 2018

39	Traje de podador (Operador Motosierra)	2						2
40	Casco protección auditiva y pantalla (Operador Motosierra)	2						2
41	Taladro.	1			1			
42	Termo de Agua 5Gls.	6	1	1	1	1	1	1
43	Tijera de corte tipo Klein 16 pulgadas.	2			1	1		
44	Radio de comunicación frecuencia EDENORTE	5	1	1	1	1		1
45	Generado eléctrico de 5 kW	2	1		1			
46	Palín	1					1	
47	Pico	1					1	
48	Pala	1					1	
49	Coa	1					1	
50	Taladro y Compresor Neumático – Dependiendo del terreno	1					1	

▪ **Herramientas y Equipos para un frente de trabajo de Brigadas de Normalización**

Herramientas brigadas Normalización consensuada por brigada (Frente de normalización)					
ID	Descripción	Cantidad Total	Canasto Normalización	Brigada ligera Normalización	Ligera Inst. Caños
1	Alicate de corte oblicuo con mango aislado 1000 V de 10 pulgadas.	2	1	1	
2	Amperímetro (Multímetro de gancho)	2	1	1	
3	Marco de segueta.	1			1
4	Cinzel Plano	1			1
5	Cinzel de Punta	1			1
6	Cizalla de Corte 36" con Mango Aislado 1000V.	3	1	1	1
7	Cuchilla pela cable con mango aislado 1000V.	3	2	1	

6 de marzo de 2018

<b>8</b>	Cuñas separadoras de fases para cable triplex de material plástico.	<b>2</b>	2		
<b>9</b>	Detector de tensión rango 2 a 35 kV.	<b>1</b>	1		
<b>10</b>	Detector de tensión rango (Detector voltaje portátil 0- 600V )	<b>1</b>		1	
<b>11</b>	Escalera doble extensión de 32 pies de fibra vidrio	<b>1</b>	1		
<b>12</b>	Escalera doble de extensión de 14 (Verificar la altura 20) pies de fibra vidrio.	<b>1</b>		1	
<b>13</b>	Escalera tipo tijera 8 pies (A)	<b>3</b>	1	1	1
<b>14</b>	Juego de llaves Allen.	<b>2</b>	1	1	
<b>15</b>	Juego de llaves combinadas.	<b>1</b>			1
<b>16</b>	Juego Destornilladores punta estriada con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).	<b>3</b>	1	1	1
<b>17</b>	Juego Destornilladores punta plana con mango aislado 1000V (6,8 y 10 pulgadas).	<b>3</b>	1	1	1
<b>18</b>	Llave ajustable (francesa) con mango aislado 1000V de 10 pulgadas.	<b>2</b>	1	1	
<b>19</b>	Llave ajustable o de boca número 13.	<b>2</b>			2
<b>20</b>	Llave chicharra (críquet).	<b>2</b>	1		1
<b>21</b>	Machete.	<b>2</b>	1	1	
<b>22</b>	Maquina flejadora.	<b>1</b>	1		
<b>23</b>	Martillo de bola de 2 libras.	<b>2</b>	1		1
<b>24</b>	Martillo carpintero	<b>2</b>	1		1
<b>25</b>	Pinza de punta plana con mango aislado 1000V de 10 pulgadas.	<b>3</b>	2	1	
<b>26</b>	Pinza pico de cotorra con mango aislado 1000V de 12 pulgadas.	<b>2</b>	1	1	
<b>27</b>	Pinza universal con mango aislado 1000V de 10 pulgadas.	<b>3</b>	2	1	
<b>28</b>	Prensa de compresión MD6 (Herramienta condicionada, depende si los gabinetes tienen el terminal o no)	<b>1</b>	1		
<b>29</b>	Crimpadora para cable AWG 6	<b>1</b>	1		
<b>30</b>	Soga o cuerda de trabajo (45 pies).	<b>1</b>	1		
<b>31</b>	Cuerda de vida.	<b>1</b>	1		
<b>32</b>	Arnés de Seguridad con sistema anticaídas	<b>1</b>	1		
<b>33</b>	Spot light.	<b>1</b>	1		

6 de marzo de 2018

<b>34</b>	Taladro impacto	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>35</b>	Taladro atornillador eléctrico recargable	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>36</b>	Termo de Agua 5Gls.	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>37</b>	Generado eléctrico	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>38</b>	Equipo de Puesta a Tierra con pértiga >20 KA.	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>39</b>	Vara telescópica aislada 20kv 35`	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>40</b>	Guantes dieléctricos BT CLASE 0 (0 - 1000 v)	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>41</b>	Guantes aislados MT Clase 2 ( 17Kv)	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>42</b>	Kit anti derrames	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	Nivel de 12 pulgadas con imán	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>44</b>	Extensión eléctrica de 100 pies	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>45</b>	Palin	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>46</b>	Cinzel de punta de 6 pies para hoyar	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>47</b>	Coa	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>48</b>	Plana	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>49</b>	Pala	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>50</b>	Pisón	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>51</b>	Maseta	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>52</b>	Cinta Métrica	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>53</b>	Cinta de campo	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>54</b>	Inversor para vehículo 500 -1000 W (Para tomar lectura de medidores existentes)	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>55</b>	Rotuladora (Impresión de label en cajas de derivación, borneras, paneles)	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>56</b>	Numerador (Se usa para identificar la carga en los gabinetes y cajas borneras)	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>57</b>	Nock out 1, 1 1/2, 2 pulgadas	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>58</b>	Carretilla	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>59</b>	Escobillón	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>60</b>	Cubo	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>61</b>	Fundas negras	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>



### ▪ Ropa de Trabajo

La ropa trabajo debe ser proporcionada al inicio del proyecto y sustituidos a medida que presenten deterioro.

Ropa de Trabajo por Técnico		
ID	Descripción	Cant.
1	Zapato de Seguridad para Electricista.	1
2	Camisa manga larga con elementos reflectivos, según requerimiento de EDEESTE	2
3	Pantalón sin partes metálicas, según requerimiento de EDENORTE	2

### ▪ Equipos de Protección Personal (EPP)

Los equipos de protección personal deben ser proporcionados al inicio del proyecto y sustituidos a medida que presenten deterioro.

EPP por Técnico		
ID	Descripción	Cant.
1	Casco de seguridad según Norma ANSI Z89.1 – 2003 Clase "E"	1
2	Chalecos reflectivos.	1
3	Cinturón de Seguridad.	1
4	Guante Clase 2 (par).	1
5	Guantes dieléctricos clase 0 p/1000 V (par).	1
6	Guantes rústicos (par)	4
7	Lentes Antirrayaduras a prueba de impacto Claro.	1
8	Lentes Antirrayaduras a prueba de impacto Oscuro.	1

### ▪ Equipos de Protección Colectivos (EPC)

Los equipos de protección colectivos deben ser proporcionados al inicio del proyecto y sustituidos a medida que presenten deterioro.

EPC por Brigada		
ID	Descripción	Cant.
1	Arnés de seguridad tipo contra caída para cada linero.	2
2	Botiquín de Seguridad. Detallar contenido	1
3	Conos reflectivos de 30 pulgadas señalización Grande.	4
4	Extintor 2.5Lbs. tipo	1

Todas las herramientas y equipos de seguridad deberán cumplir con las especificaciones técnicas normalizadas por EDENORTE para herramientas y equipos de este tipo.

#### 4- Características Vehículos Requeridos

Los vehículos deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- **Camión Grúa de 12 Toneladas:**

Grúa de 12 toneladas para izado de postes de hormigón o metálicos según capacidad, con brazo articulado o telescópico, mínimo de 45 pies de boom, con una antigüedad máxima de quince (15) años, con un sello de tamaño y estilo predeterminado que diga "Contratista al Servicio de EDENORTE", según corresponda y hacer referencia al préstamo (número) y organismo financiador del proyecto en cuestión.

Debe poseer plataformas de apoyo y estribos para el transporte de postes y transformadores.

En lo posible, debe tener 1 equipo tirador de cables (guinche).

Los camiones deberán estar equipados con un equipo de radiocomunicación y estar en buen estado mecánico de carrocería, puertas, ventanas, etc. Deberán contar sistema de localización de GPS y tener sus documentos al día. Deberán poseer extintor, botiquín y todos los equipos de seguridad exigidos por EDENORTE

Se deberá presentar, junto a la oferta, evidencia fotográfica del estado actual del equipo, sea propio o contratado, así como su matrícula y otros documentos de propiedad del mismo.

- **Camión Grúa de 7 Toneladas:**

Grúa de 7 toneladas para izado de postes metálicos e instalación de transformadores según capacidad, con brazo articulado o Telescópico, mínimo de 45 pies de boom, con una antigüedad máxima de quince (15) años, con un sello de tamaño y estilo predeterminado que diga "Contratista al Servicio de EDENORTE", según corresponda y hacer referencia al préstamo (número) y organismo financiador del proyecto en cuestión.

Debe poseer plataformas de apoyo y estribos para el transporte de postes y transformadores.

En lo posible, debe tener 1 equipo tirador de cables (guinche).

Los camiones deberán estar equipados con un equipo de radiocomunicación y estar en buen estado mecánico de carrocería, puertas, ventanas, etc. Deberán contar sistema de

localización de GPS y tener sus documentos al día. Deberán poseer extintor, botiquín y todos los equipos de seguridad exigidos por EDENORTE.

Se deberá presentar, junto a la oferta, evidencia fotográfica del estado actual del equipo, sea propio o contratado, así como su matrícula y otros documentos de propiedad del mismo.

▪ **Camión Canasto:**

Camión canasto aislado de 45 pies mínimo, con una antigüedad máxima de quince (15) años, con un sello de tamaño y estilo predeterminado que diga "Contratista al Servicio de EDENORTE", según corresponda y hacer referencia al préstamo (número) y organismo financiador del proyecto en cuestión.

Los camiones que se usen para el transporte de postes, deberán tener plataformas de apoyo.

Los camiones deberán tener espacio para carga y estar equipados con un equipo de radiocomunicación, con buen estado mecánico de carrocería, puertas, ventanas, etc. Deberán contar sistema de localización de GPS y tener sus documentos al día. Deberán poseer extintor, botiquín y todos los equipos de seguridad exigidos por EDENORTE.

Se deberá presentar, junto a la oferta, evidencia fotográfica del estado actual del equipo, sea propio o contratado, así como su matrícula y otros documentos de propiedad del mismo.

▪ **Furgoneta:**

Vehículo cerrado tipo furgoneta, modelo no superior a 5 años y un máximo de 150,000 Km de mantenimiento de servicio. El vehículo deberá estar equipado con porta escalera y con una caja porta herramienta y equipos ubicada en la parte interior trasera del mismo. Esta unidad será utilizada para realizar los trabajos de normalización de suministros a fin de resguardar de manera especial la integridad de los medidores y sellos de protección. Deberá contener un sello de tamaño y estilo predeterminado que diga "Contratista al Servicio de EDENORTE", según corresponda y hacer referencia al préstamo (número) y organismo financiador del proyecto en cuestión.

▪ **Camión Cama Lisa:**

Camión cama lisa para brigadas ligeras, con quince (15) años de antigüedad máxima, de 4 toneladas mínimo, similar a: Daihatsu Delta, Mitsubishi Canter, Camión Isuzu o Hyundai de la misma capacidad, con un letrero de tamaño y estilo predeterminado que diga "Contratista al Servicio de EDENORTE", según corresponda y hacer referencia al préstamo (número) y

organismo financiador del proyecto en cuestión. Equipado con porta escaleras y caja de herramientas. Deberá contar

Los camiones deberán tener espacio para carga y estar equipados con un equipo de radiocomunicación, con buen estado mecánico, de carrocería, puertas, ventanas, etc. Deberán contar sistema de localización de GPS y tener sus documentos al día. Deberán poseer extintor, botiquín y todos los equipos de seguridad exigidos por EDENORTE.

Se deberá presentar, junto a la oferta, evidencia fotográfica del estado actual del equipo, sea propio o contratado, así como su matrícula y otros documentos de propiedad del mismo.

▪ **Camioneta:**

Vehículo de diez (10) años de antigüedad máxima. Camioneta Doble Cabina, con un sello de tamaño y estilo predeterminado que diga "Contratista al Servicio de EDENORTE", según corresponda y hacer referencia al préstamo (número) y organismo financiador del proyecto en cuestión.

Este vehículo será utilizado por los supervisores y el equipo de apoyo del contratista durante la ejecución del proyecto.

De capacidad igual o mayor a 750Kg de carga y equipado con porta escalera, caja de herramientas, equipo de radio comunicación. En buen estado mecánico y documentación al día. Deberá poseer extintor y botiquín y todos los equipos de seguridad exigidos por EDENORTE.

Deberán contar sistema de localización de GPS.

Se deberá presentar, junto a la oferta, evidencia fotográfica del estado actual del equipo, sea propio o contratado, así como su matrícula y otros documentos de propiedad del mismo.

▪ **Otras consideraciones:**

EDENORTE podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones antes establecidas, al igual que podrá verificar el estado técnico-mecánico y de presentación de los vehículos, y solicitar la documentación exigida por las entidades gubernamentales y que garantiza el adecuado rodamiento de los vehículos utilizados para la movilización del

personal del contratista, pudiendo tomar acciones correctivas como la inmovilización de la brigada, cuando los mismos no cumplieren con condiciones mínimas de operación.

Así mismo, el contratista deberá asumir la totalidad de insumos y de costos asociados a desplazamiento dentro y fuera de la ciudad (peajes), así como los gastos de parqueo, evitando parquear los vehículos en la vía pública durante la ejecución de las actividades en las zonas o sectores donde sea restringido.

Se exigirá estricto cumplimiento de la LEY NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE, el buen uso de los vehículos y sus identificaciones, excelente desempeño de los vehículos dispuestos para el desarrollo de la relación jurídica surgida de la oferta y la buena conducta de quien maneje el vehículo.

Adicionalmente, los vehículos deberán permanecer en perfectas condiciones mecánicas, de limpieza y presentación diaria. Deberán portar sus respectivos equipos de carretera y equipos de primeros auxilios, al igual que portarán los documentos que determine la Ley.

El contratista debe presentar a EDENORTE anualmente el seguro obligatorio y una certificación técnico-mecánica, expedida por un centro de diagnóstico automotriz autorizado de todos los vehículos utilizados en la operación.

El contratista debe velar por que los centros de servicio utilizados en el mantenimiento de los vehículos se encuentren registrado como acopiador primario de aceites usados y autorizado por las autoridades ambientales para desarrollar esta actividad. Si el mantenimiento es realizado en las instalaciones del contratista deberá dar cumplimiento a todos los requerimientos de la legislación ambiental vigente.

El servicio de vehículos puede ser subcontratado a una empresa transportadora que cumpla con los requisitos exigidos por ley, registrada en la cámara de comercio y que tenga vigente su licencia de funcionamiento. Será obligación única del contratista y exime a las empresas distribuidoras de la relación contractual para la subcontratación de este servicio con la Empresa Transportadora. Sin embargo, previa a la subcontratación el contratista presentará, las condiciones y términos de dicha contratación.

El contratista será responsable de todos los incidentes y accidentes que se puedan derivar de la ejecución de la presente oferta por la utilización de estos vehículos, lo cual será respaldado al incluirse en la póliza de seguro de responsabilidad civil.

## 5- Espacio de Almacenes

El Contratista deberá disponer de almacenes con capacidad adecuada, en el que estarán perfectamente clasificados e identificados todos los materiales de aportación propia y de aportación por parte de las empresas distribuidoras. Ambos tipos de materiales estarán separados.

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para el correcto almacenaje de los materiales tanto de aportación propia como por parte de las empresas distribuidoras, a fin de evitar roturas, fallos de funcionamiento del material y/o deformaciones por mala colocación de los mismos.

Del mismo modo, el contratista será responsable del correcto almacenamiento de transformadores y otros equipos que contengan aceite dieléctrico, a fin de evitar derrames que puedan impactar sensiblemente el medio ambiente.

Las empresas distribuidoras podrán solicitar al contratista, en cualquier momento que estimen pertinente, una relación de los materiales recibidos, despachados e instalados en campo, para lo cual el contratista deberá mantener registros actualizados de los despachos realizados a las brigadas. Cualquier desvío no justificado será de entera responsabilidad de la empresa contratista.

Los espacios de almacenes requeridos para los materiales de este lote es el siguiente:

Lote	Circuito	Área Techada (m2)	Área Intemperie (m2)	Área Total (m2)
xx	NAGU101	566	1,173	1,739



**Leonel Gabot Bonilla**

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en: 

