Cronograma Modelo MCRI101

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Circuito MCRI101**	**213 días**	**lun 27/6/16**	**mié 19/4/17**	
2		**Adquisiciones**	**89 días**	**lun 27/6/16**	**jue 27/10/16**	
3		Postes	56 días	lun 27/6/16	lun 12/9/16	
4		Herrajes y Conectores	66 días	lun 27/6/16	lun 26/9/16	
5		Conductores MT/BT/	71 días	lun 27/6/16	lun 3/10/16	
6		Transformadores y Ec	76 días	lun 27/6/16	lun 10/10/16	
7		Equipos de Medición	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16	
8		Evaluación	0 días	jue 27/10/16	jue 27/10/16	7
9		**Etapa 1**	**51.21 días**	**jue 27/10/16**	**vie 6/1/17**	
10		Izaje de Postes	8.94 días	jue 27/10/16	mar 8/11/16	
11		Armado de Estructura	5.37 días	mar 8/11/16	mié 16/11/16	10
12		Tendido de Conducto	7.45 días	mié 16/11/16	vie 25/11/16	11
13		Montaje de Transforr	5.37 días	vie 25/11/16	lun 5/12/16	12
14		Instalación de Lumina	5.37 días	lun 5/12/16	lun 12/12/16	13
15		Correcciones	1.34 días	lun 12/12/16	mar 13/12/16	14
16		Remociones	2.68 días	mar 13/12/16	vie 16/12/16	15
17		Normalización de Sun	14.69 días	vie 16/12/16	vie 6/1/17	16
18		Evaluación	0 días	vie 6/1/17	vie 6/1/17	17
19		**Etapa 2**	**51.21 días**	**mar 6/12/16**	**mié 15/2/17**	
20		Izaje de Postes	8.94 días	mar 6/12/16	vie 16/12/16	
21		Armado de Estructur	5.37 días	vie 16/12/16	lun 26/12/16	20

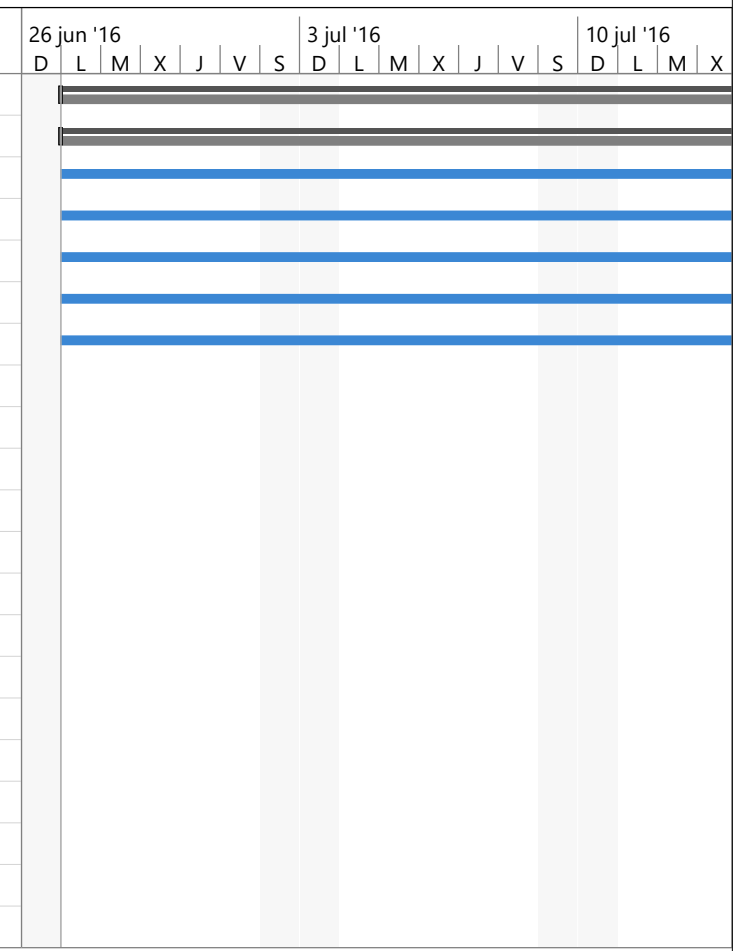

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Cronograma Modelo MCRI101

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
22		Tendido de Conducto	7.45 días	lun 26/12/16	mié 4/1/17	21
23		Montaje de Transfor	5.37 días	mié 4/1/17	jue 12/1/17	22
24		Instalación de Lumin	5.37 días	jue 12/1/17	jue 19/1/17	23
25		Correcciones	1.34 días	jue 19/1/17	vie 20/1/17	24
26		Remociones	2.68 días	vie 20/1/17	mié 25/1/17	25
27		Normalización de Su	14.69 días	mié 25/1/17	mié 15/2/17	26
28		Evaluación	0 días	mié 15/2/17	mié 15/2/17	27
29		**Cierres Técnico y Admir**	**46 días**	**mié 15/2/17**	**mié 19/4/17**	
30		Cierre Técnico	24 días	mié 15/2/17	lun 20/3/17	
31		Cierre Administrativo	22 días	mar 21/3/17	mié 19/4/17	30
32		Evaluación	0 días	mié 19/4/17	mié 19/4/17	31

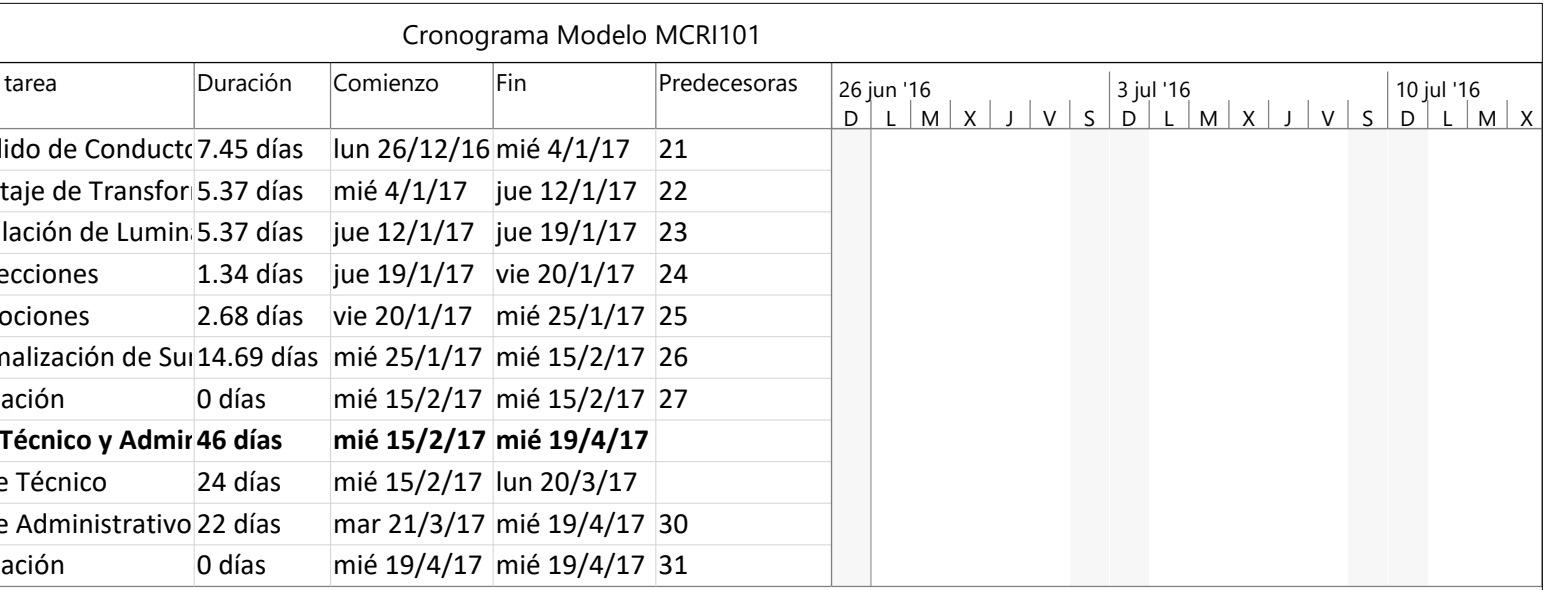

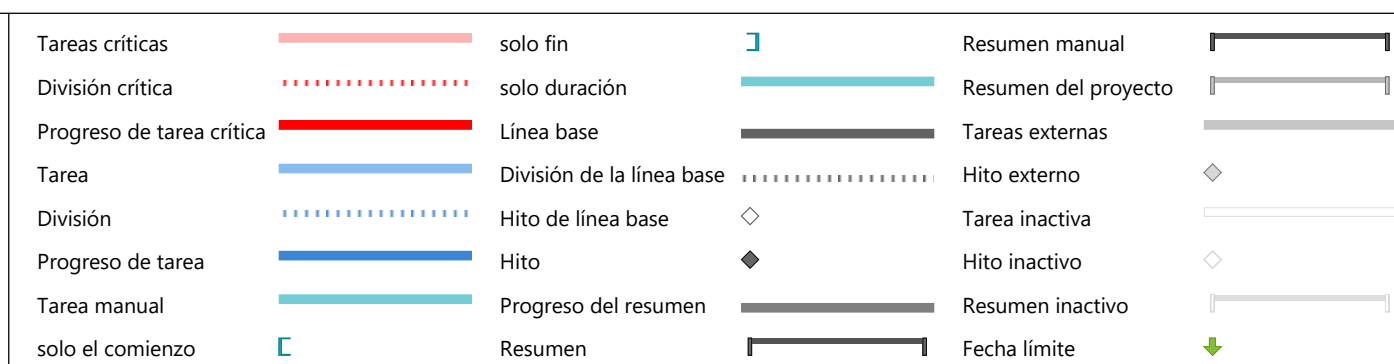

Cronograma Modelo MCRI101

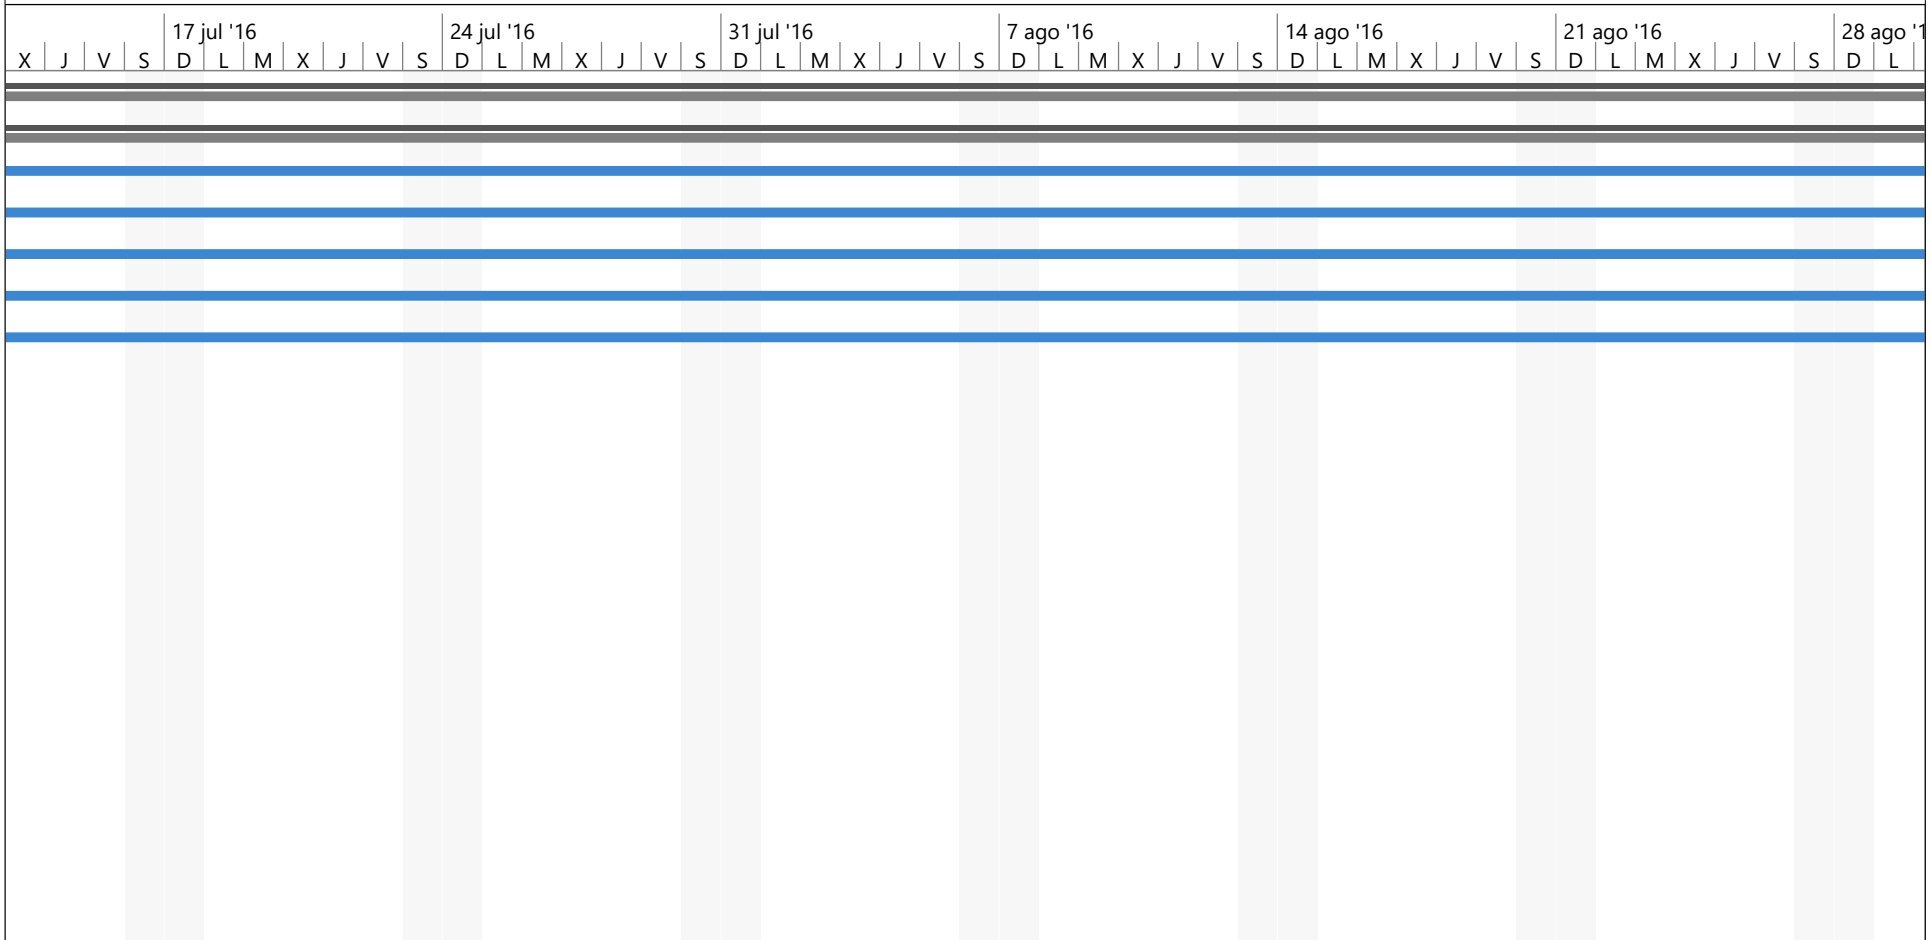

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo MCRI101

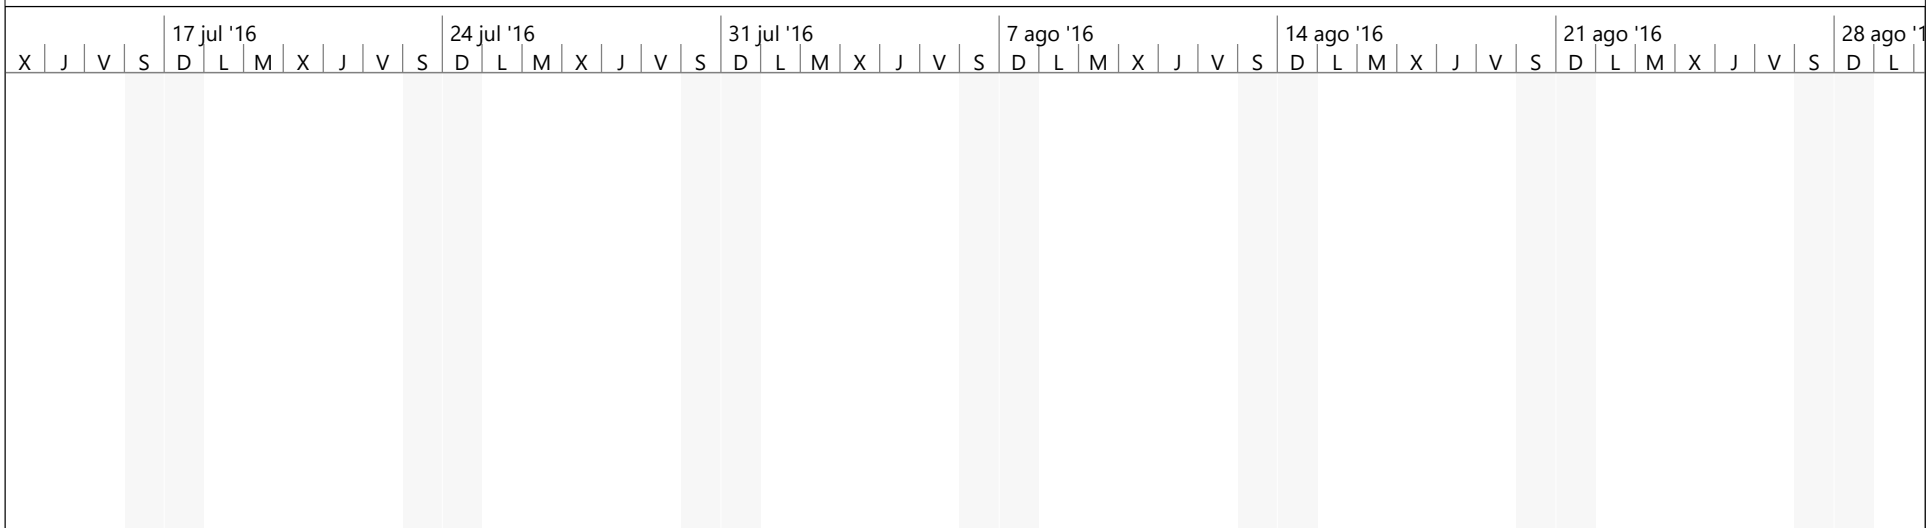

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo MCRI101

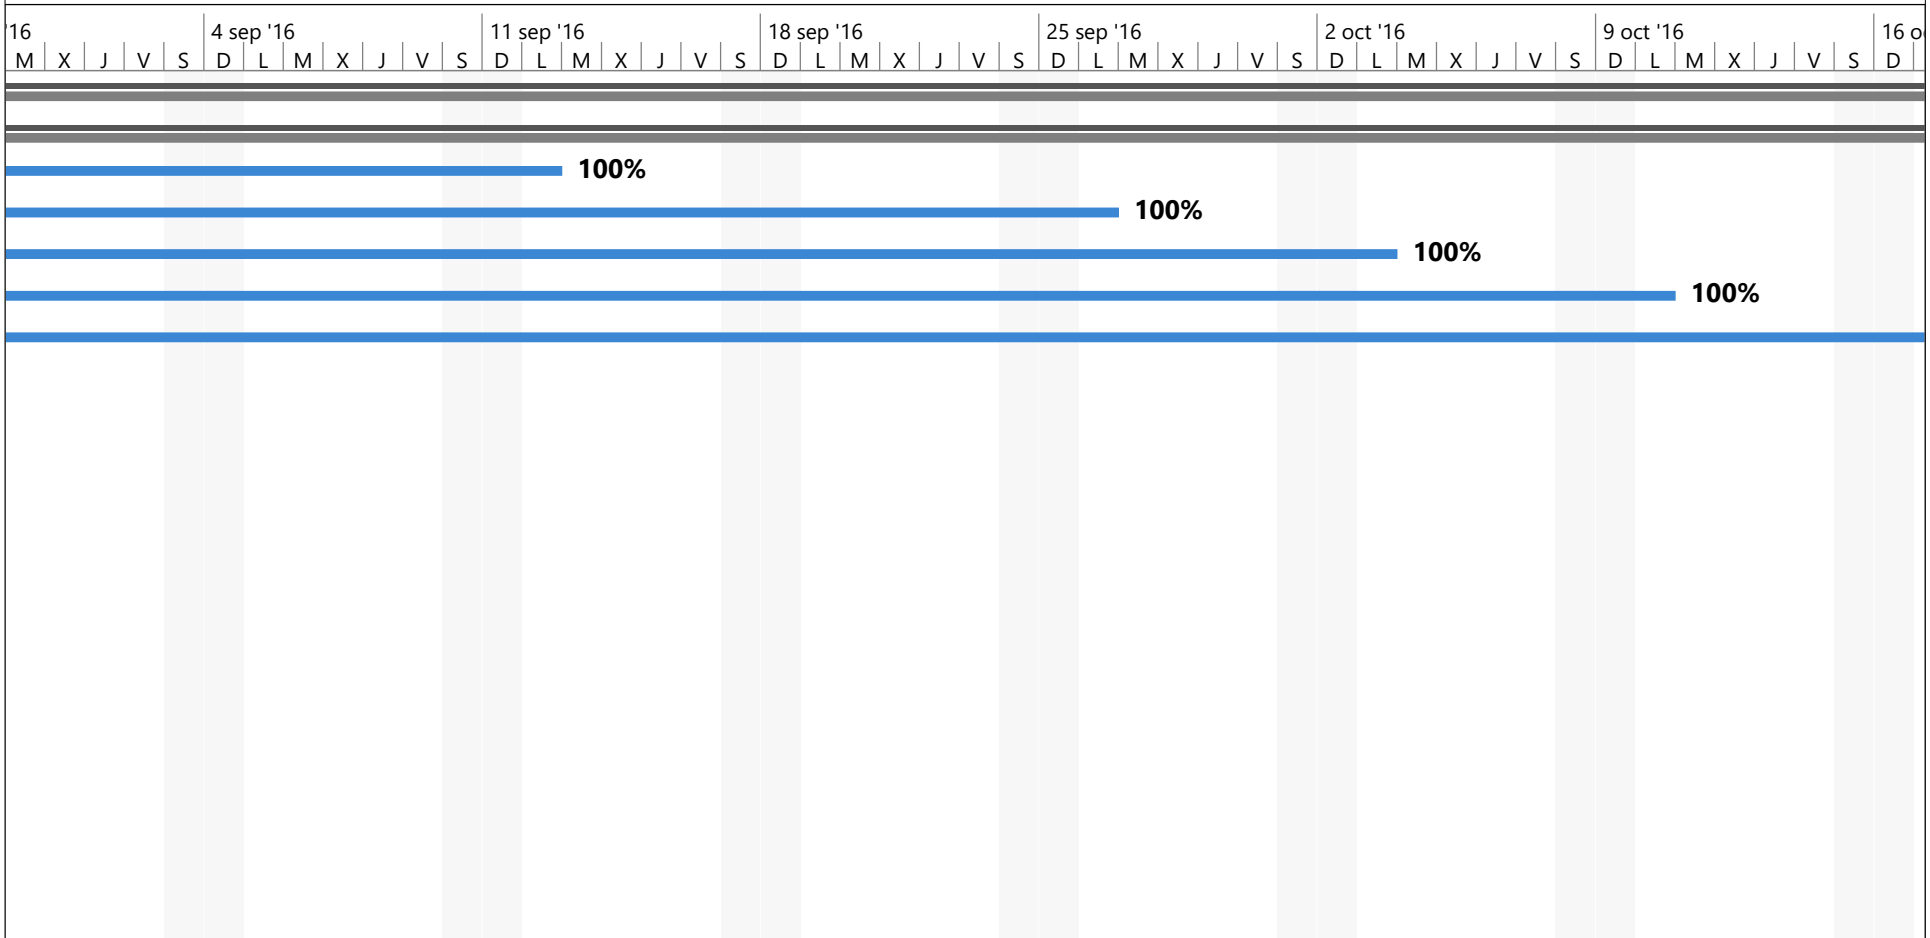

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo MCRI101

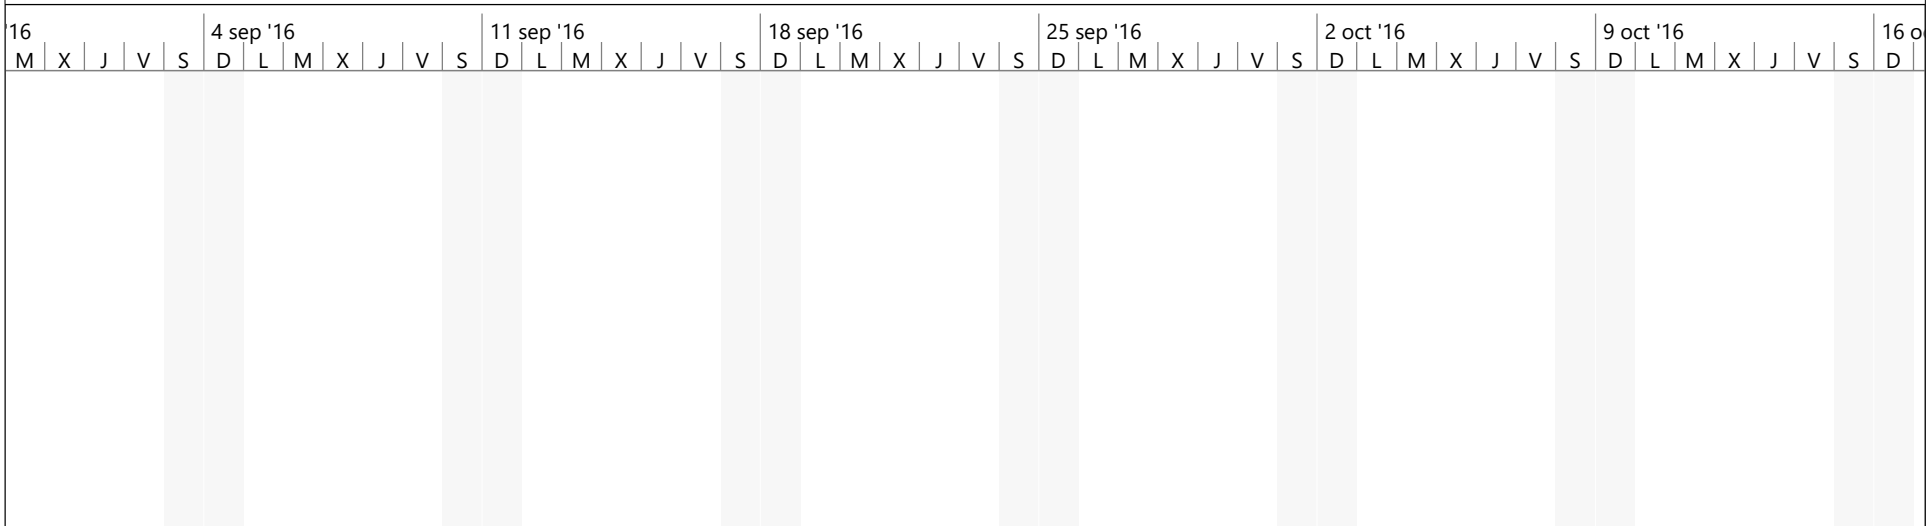

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo MCRI101

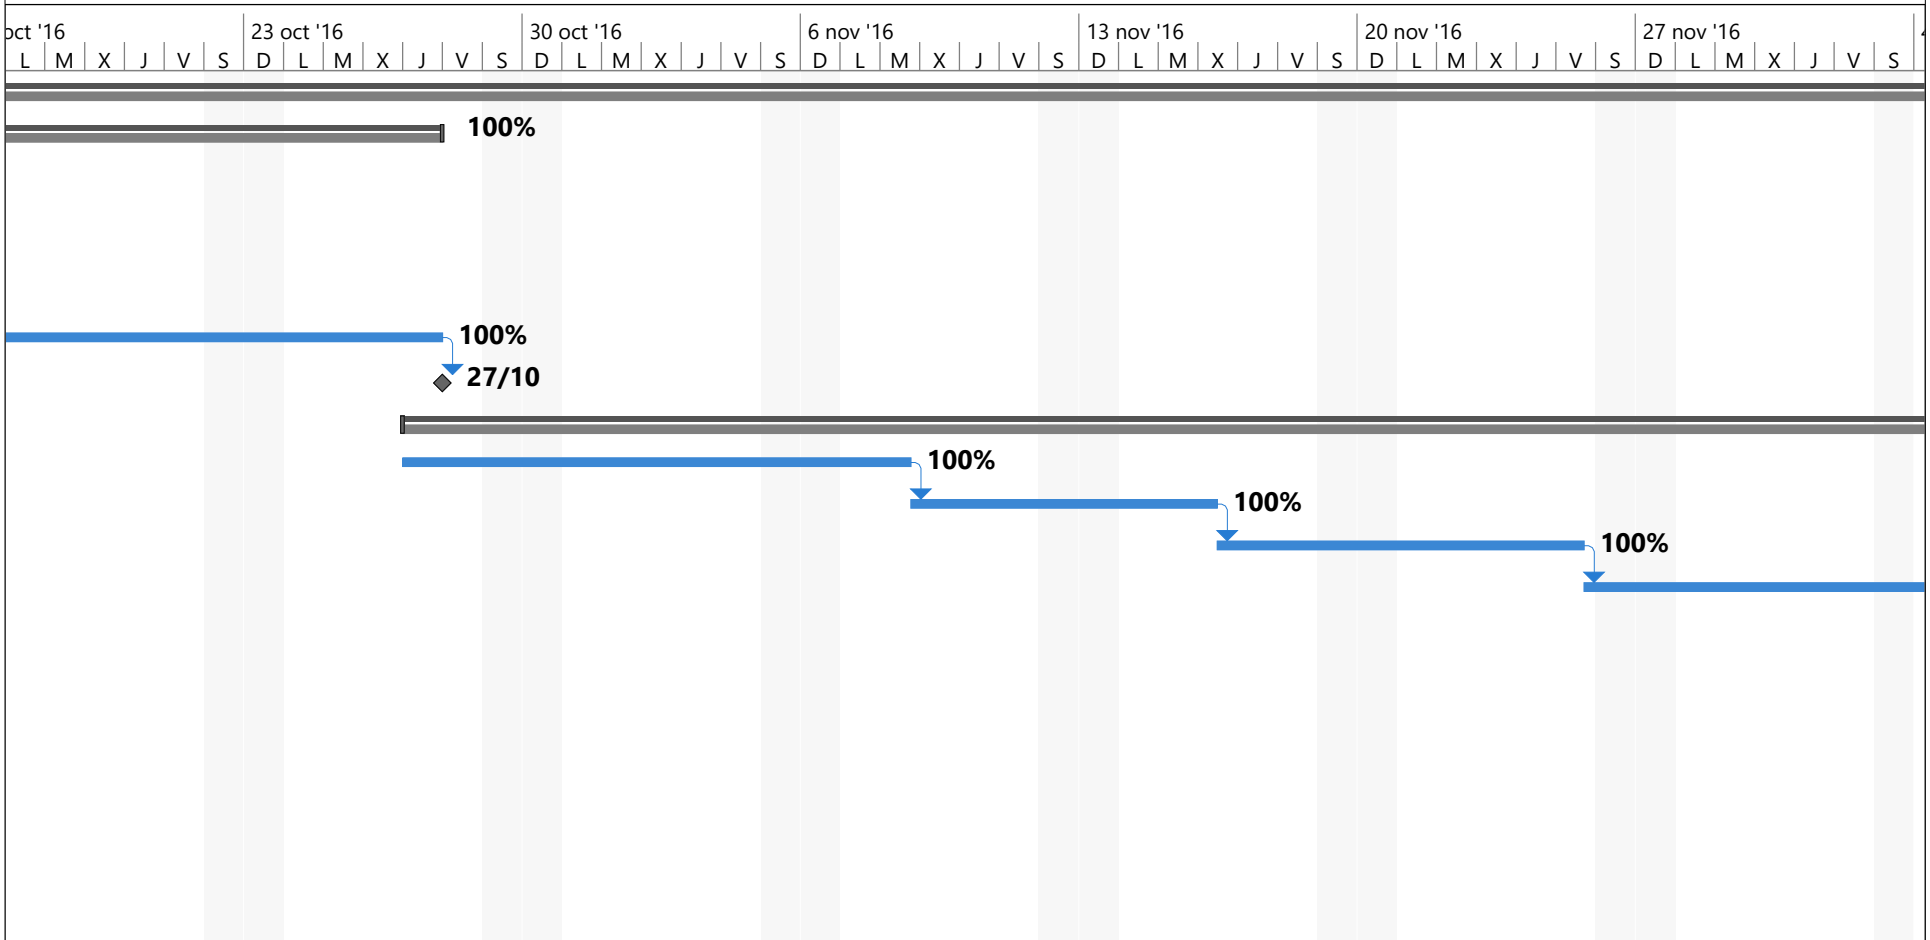

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo MCRI101

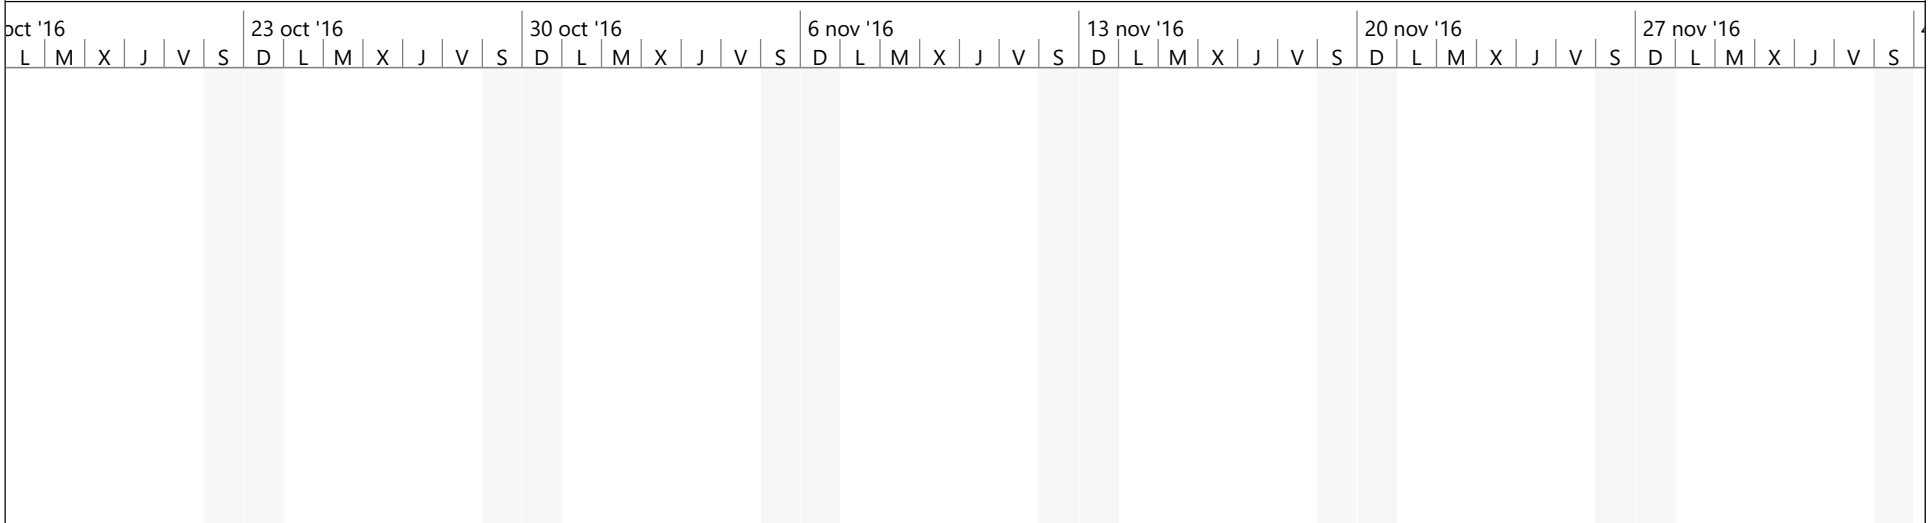

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo MCRI101

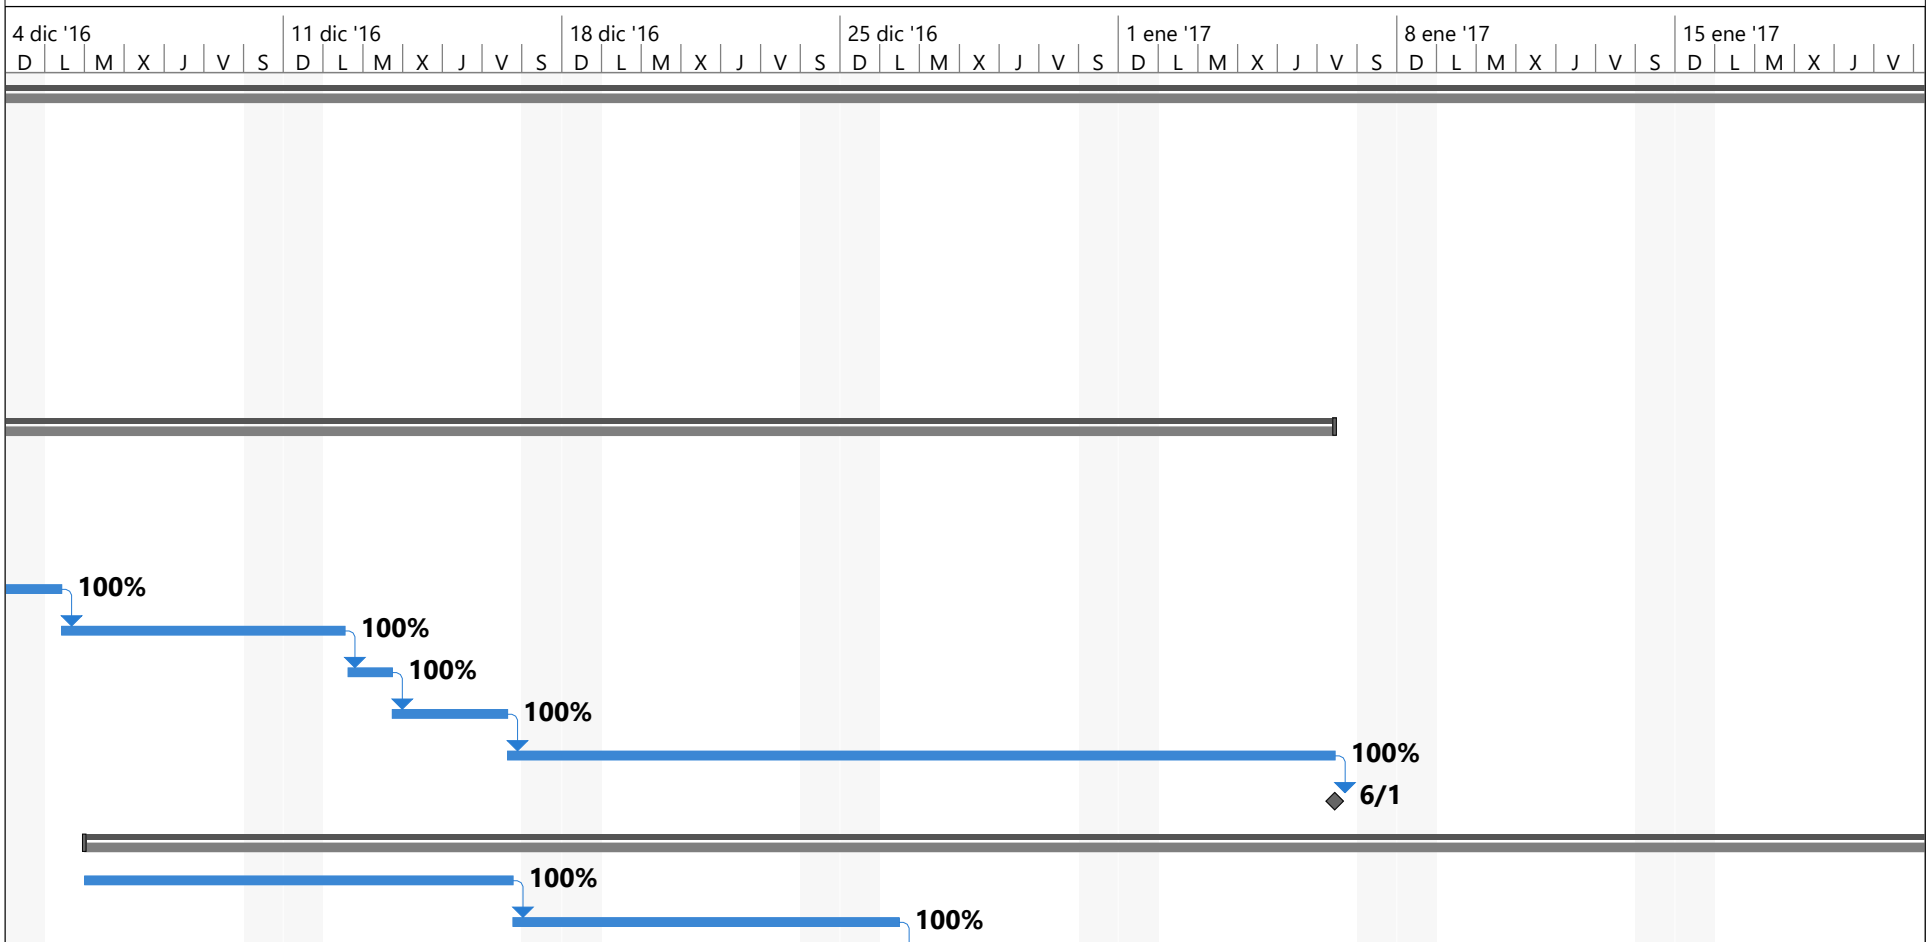

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo MCRI101

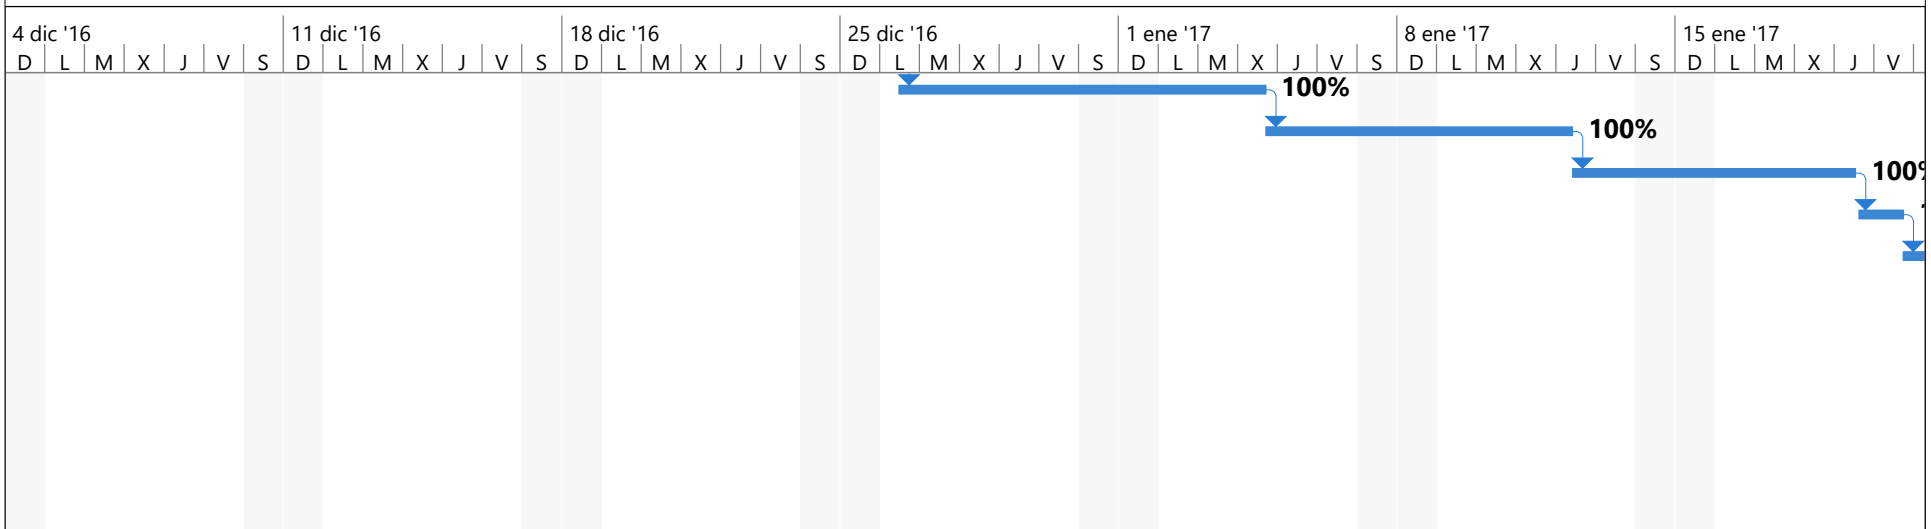

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo MCRI101

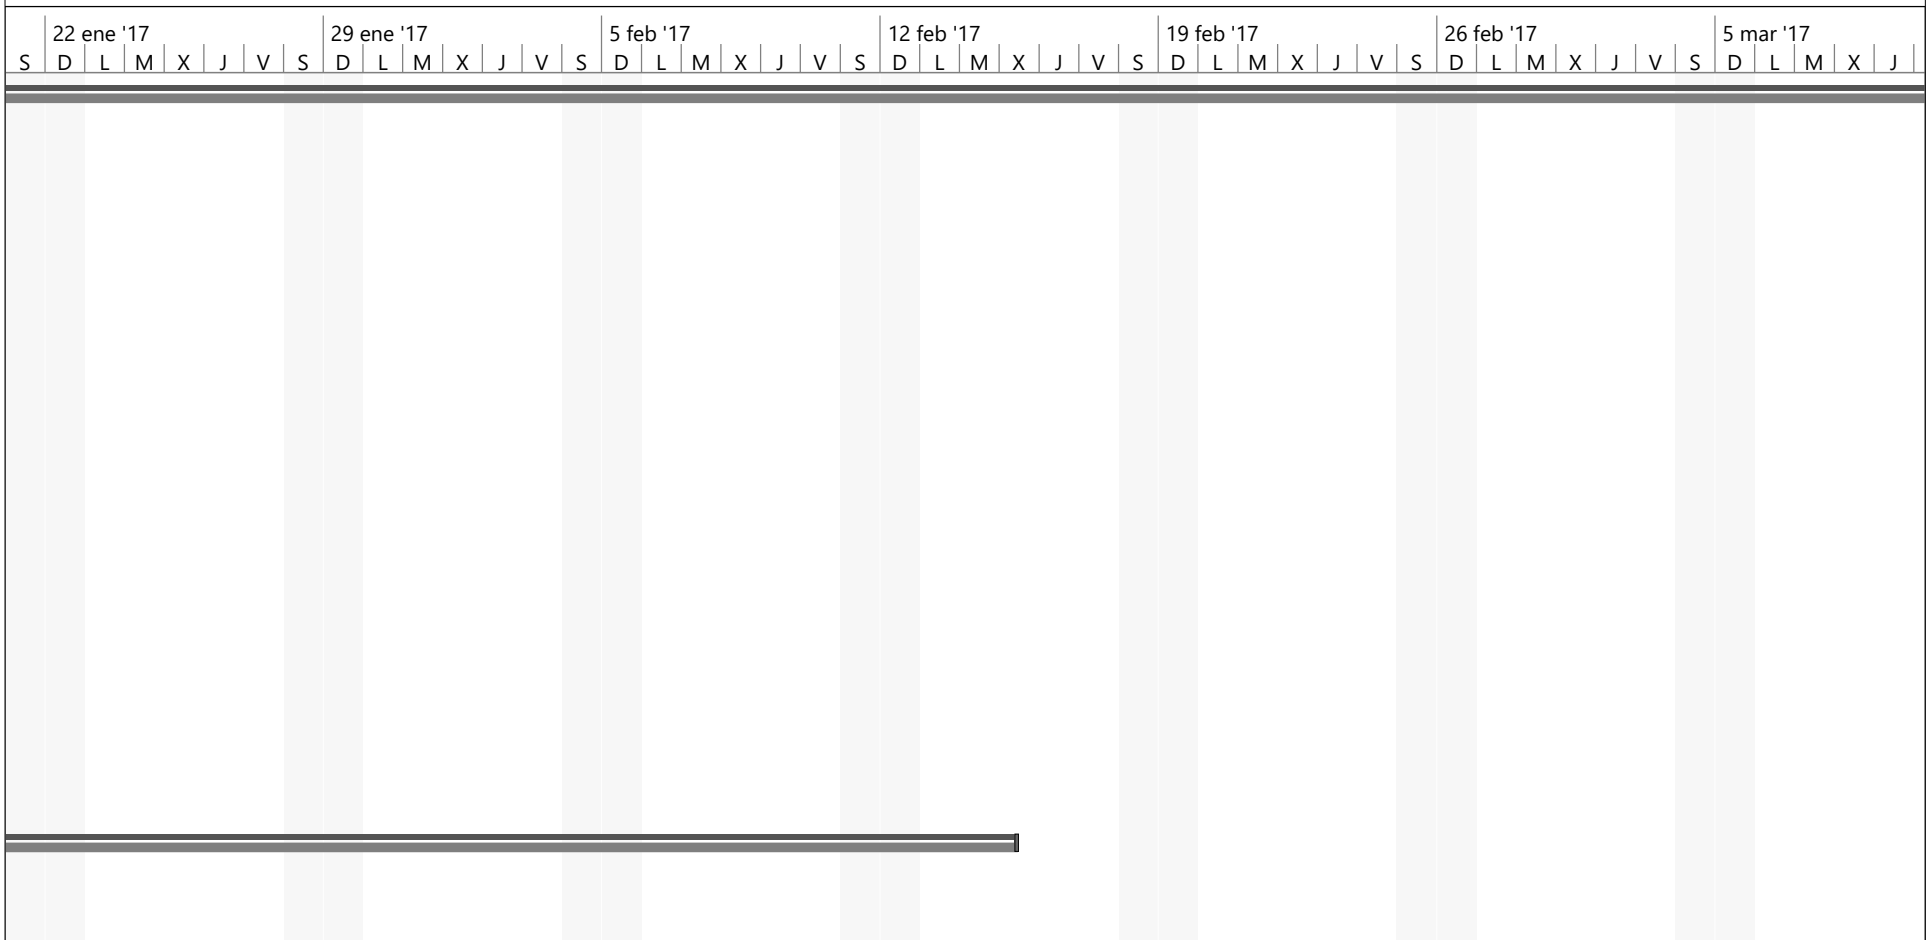

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo MCRI101

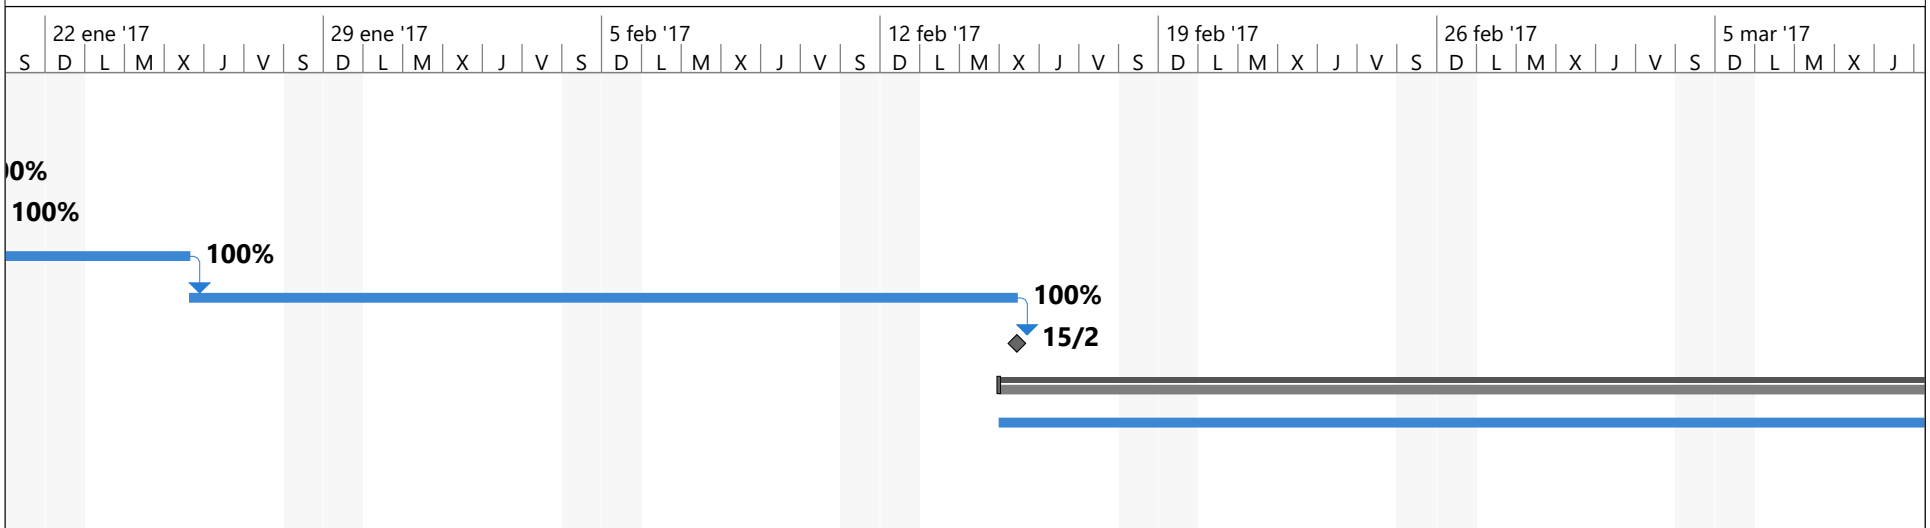

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo MCRI101

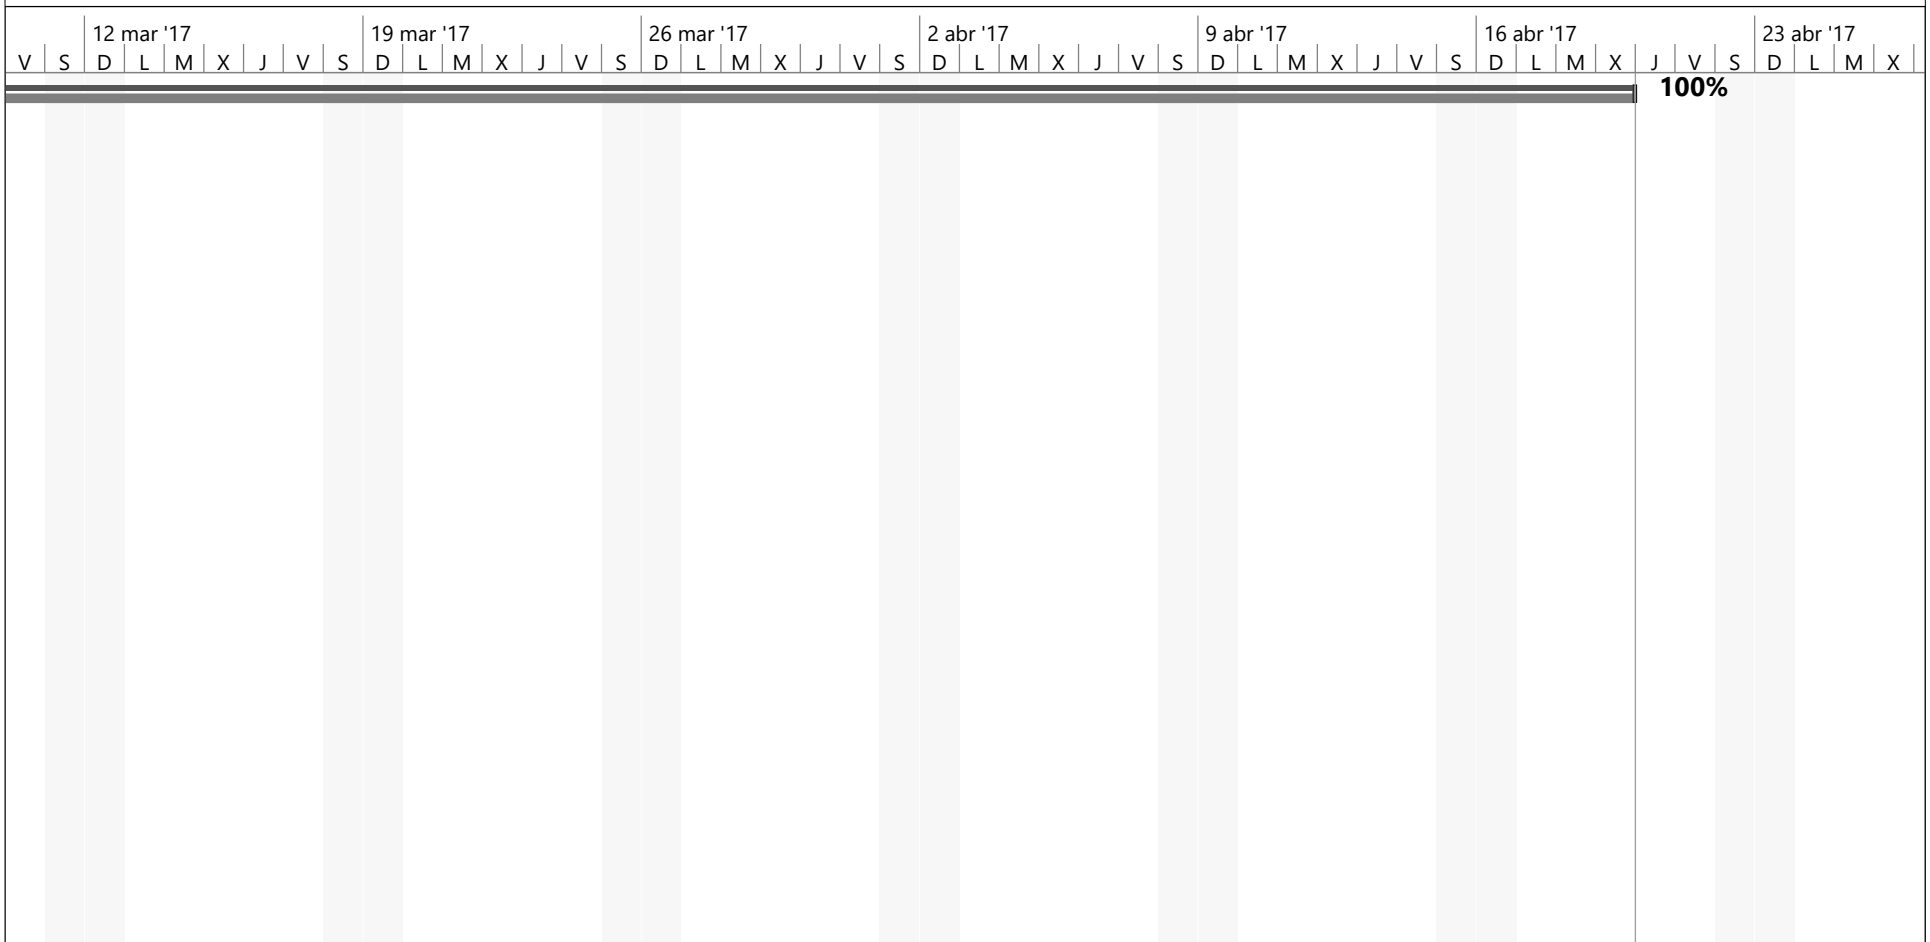

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo MCRI101

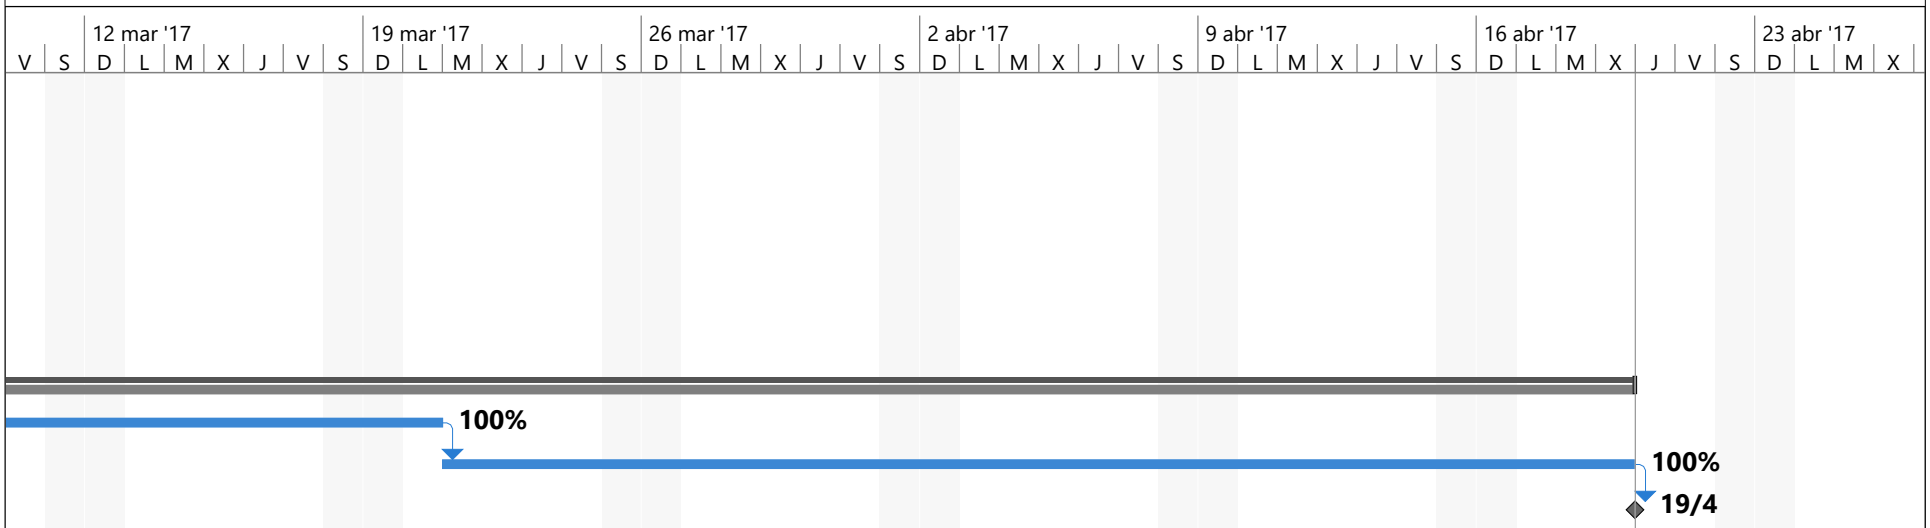

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
