


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	24 may '15		12 jul '15		30 ago '15		18 oct '15		6 dic '15															
						M	J	S	L	X	V	D	M	J	S														
1			Circuito CANA103	264 días	lun 7/12/15																								
2			Adquisiciones	89 días	lun 7/12/15																								
3			Postes	56 días	lun 7/12/15																								
4			Herrajes y Conectores	66 días	lun 7/12/15																								
5			Conductores MT/BT/Acometidas	71 días	lun 7/12/15																								
6			Transformadores y Eq. Protección	76 días	lun 7/12/15																								
7			Equipos de Medición	89 días	lun 7/12/15																								
8			Evaluación	0 días	vie 8/4/16																								
9			Etapa 1	51.21 días	lun 7/3/16																								
10			Izaje de Postes	8.94 días	lun 7/3/16																								
11			Armado de Estructura	5.37 días	jue 17/3/16																								
12			Tendido de Conducto	7.45 días	vie 25/3/16																								
13			Montaje de Transformadores	5.37 días	mar 5/4/16																								
14			Instalación de Luminarias	5.37 días	mié 13/4/16																								
15			Correcciones	1.34 días	mié 20/4/16																								
16			Remociones	2.68 días	jue 21/4/16																								

Proyecto: Cronograma Modelo CA
Fecha: jue 29/6/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	24 may '15			12 jul '15			30 ago '15			18 oct '15			6 dic '15		
						M	J	S	L	X	V	D	M	J	S					
17			Normalización de Suministros	14.69 días	mar 26/4/16															
18			Evaluación	0 días	mar 17/5/16															
19			Etapas 2 y 3	51.21 días	jue 21/4/16															
20			Izaje de Postes	8.94 días	jue 21/4/16															
21			Armado de Estructura	5.37 días	mar 3/5/16															
22			Tendido de Conductores	7.45 días	mié 11/5/16															
23			Montaje de Transformadores	5.37 días	vie 20/5/16															
24			Instalación de Luminarias	5.37 días	lun 30/5/16															
25			Correcciones	1.34 días	lun 6/6/16															
26			Remociones	2.68 días	mar 7/6/16															
27			Normalización de Suministros	14.69 días	vie 10/6/16															
28			Evaluación	0 días	vie 1/7/16															
29			Etapas 4 y 5	51.21 días	mar 7/6/16															
30			Izaje de Postes	8.94 días	mar 7/6/16															
31			Armado de Estructura	5.37 días	vie 17/6/16															
32			Tendido de Conductor	7.45 días	lun 27/6/16															


Proyecto: Cronograma Modelo CA Fecha: jue 29/6/17	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	24 may '15		12 jul '15		30 ago '15		18 oct '15		6 dic '15	
						M	J	S	L	X	V	D	M	J	S
33			Montaje de Transformadores	5.37 días	mié 6/7/16										
34			Instalación de Luminarias	5.37 días	jue 14/7/16										
35			Correcciones	1.34 días	jue 21/7/16										
36			Remociones	2.68 días	vie 22/7/16										
37			Normalización de Suministros	14.69 días	mié 27/7/16										
38			Evaluación	0 días	mié 17/8/16										
39			Etapas 6	51.21 días	mié 27/7/16										
40			Izaje de Postes	8.94 días	mié 27/7/16										
41			Armado de Estructur	5.37 días	lun 8/8/16										
42			Tendido de Conductor	7.45 días	mar 16/8/16										
43			Montaje de Transformadores	5.37 días	jue 25/8/16										
44			Instalación de Luminarias	5.37 días	vie 2/9/16										
45			Correcciones	1.34 días	vie 9/9/16										
46			Remociones	2.68 días	lun 12/9/16										

Proyecto: Cronograma Modelo CA Fecha: jue 29/6/17	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	24 may '15			12 jul '15			30 ago '15			18 oct '15			6 dic '15		
						M	J	S	L	X	V	D	M	J	S					
47			Normalización de Suministros	14.69 días	jue 15/9/16															
48			Evaluación	0 días	jue 6/10/16															
49			Cierres Técnico y Administrativo	46 días	jue 6/10/16															
50			Cierre Técnico	24 días	jue 6/10/16															
51			Cierre Administrativo	22 días	mié 9/11/16															
52			Evaluación	0 días	vie 9/12/16															




Proyecto: Cronograma Modelo CA Fecha: jue 29/6/17	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			

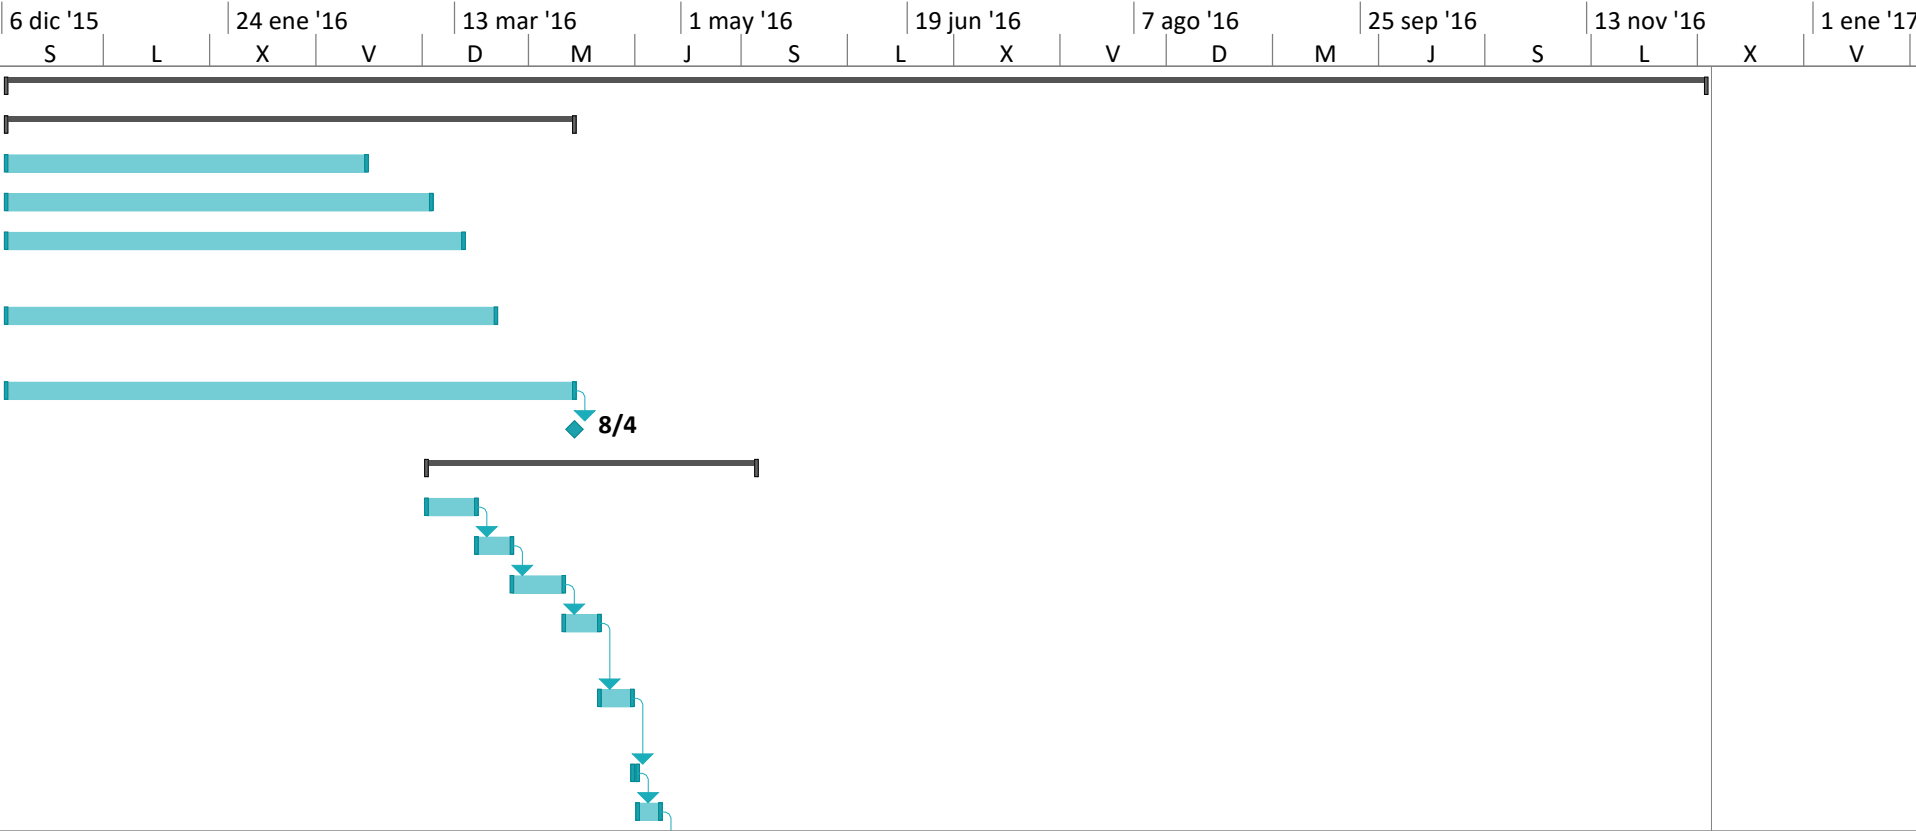


Proyecto: Cronograma Modelo CA Fecha: jue 29/6/17	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			

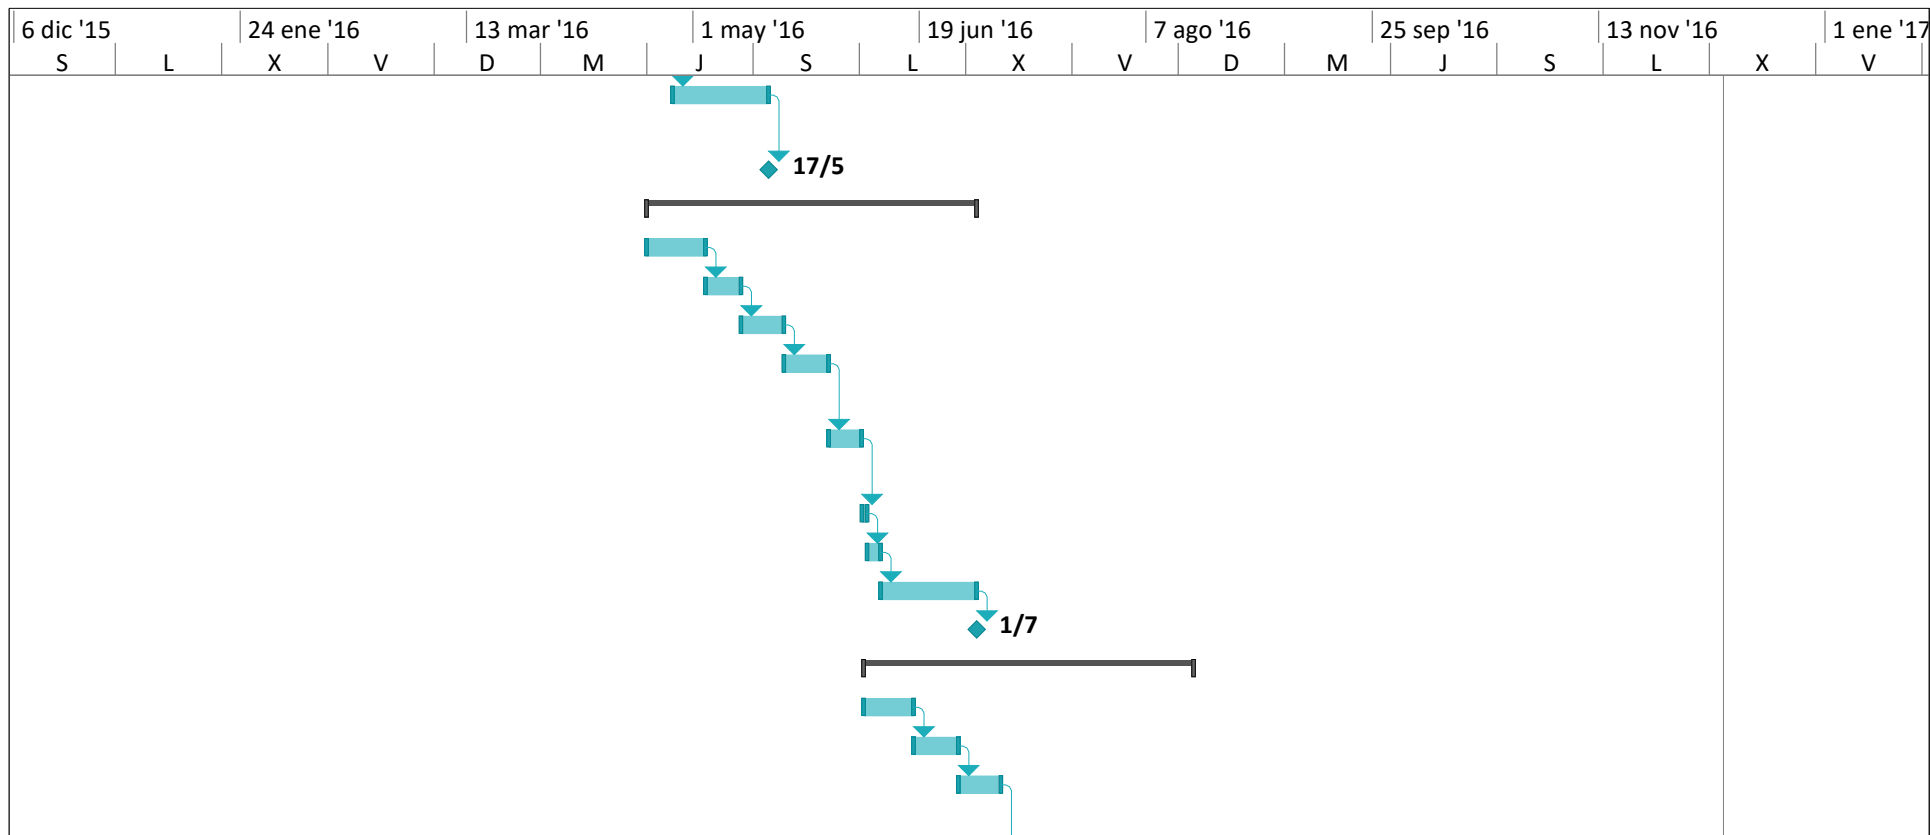

Proyecto: Cronograma Modelo CA Fecha: jue 29/6/17	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			

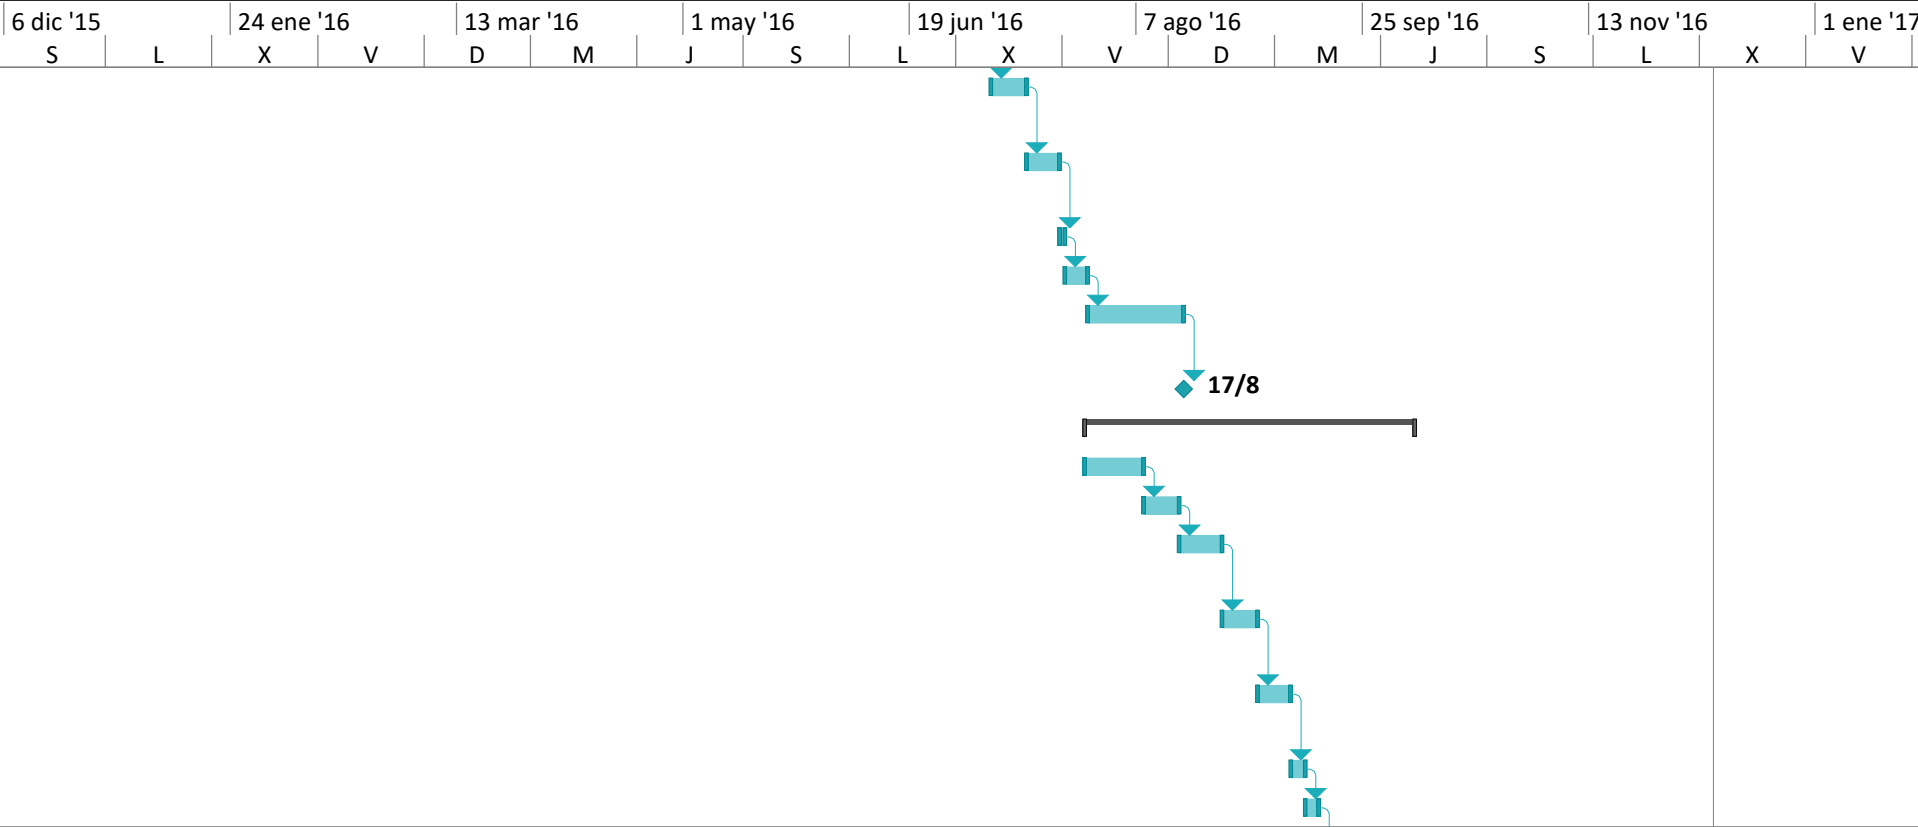

Proyecto: Cronograma Modelo CA Fecha: jue 29/6/17	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			

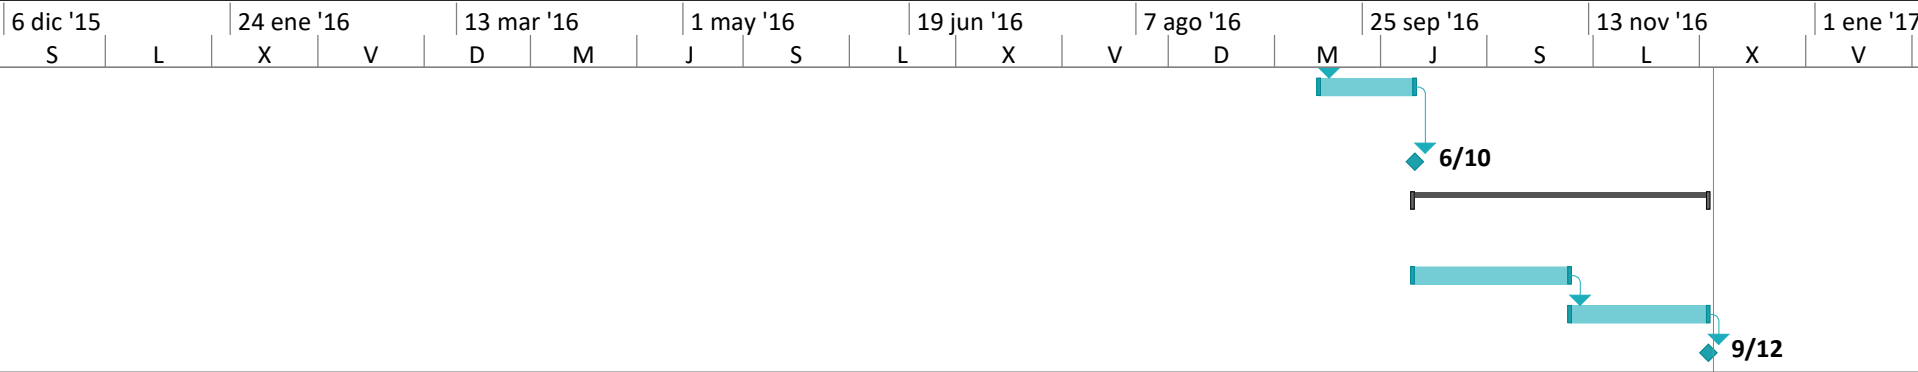

Proyecto: Cronograma Modelo CA Fecha: jue 29/6/17	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			
