

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	7 ago '16		25 sep '16			13 nov '16	
						V	D	M	J	S	L	X
1		Circuito NIBA104	277 días	vie 9/9/16	lun 2/10/17							
2		Adquisiciones	89 días	vie 9/9/16	mié 11/1/17							
3		Postes	56 días	vie 9/9/16	vie 25/11/16							
4		Herrajes y Conectores	66 días	vie 9/9/16	vie 9/12/16							
5		Conductores MT/BT/Acometidas	71 días	vie 9/9/16	vie 16/12/16							
6		Transformadores y Eq. Protección	76 días	vie 9/9/16	vie 23/12/16							
7		Equipos de Medición	89 días	vie 9/9/16	mié 11/1/17							
8		Evaluación	0 días	mié 11/1/17	mié 11/1/17							
9		Etapa 1	51.21 días	mié 11/1/17	jue 23/3/17							
10		Izaje de Postes	8.94 días	mié 11/1/17	lun 23/1/17							
11		Armado de Estructura	5.37 días	lun 23/1/17	mar 31/1/17							
12		Tendido de Conducto	7.45 días	mar 31/1/17	jue 9/2/17							
13		Montaje de Transformadores	5.37 días	jue 9/2/17	vie 17/2/17							
14		Instalación de Luminarias	5.37 días	vie 17/2/17	vie 24/2/17							
15		Correcciones	1.34 días	vie 24/2/17	lun 27/2/17							
16		Remociones	2.68 días	lun 27/2/17	jue 2/3/17							

Proyecto: Cronograma Modelo NI
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	7 ago '16			25 sep '16			13 nov '16		
						V	D	M	J	S	L	X		
17		Normalización de Suministros	14.69 días	jue 2/3/17	jue 23/3/17									
18		Evaluación	0 días	jue 23/3/17	jue 23/3/17									
19		Etapa 2	51.21 días	jue 23/2/17	vie 5/5/17									
20		Izaje de Postes	8.94 días	jue 23/2/17	mar 7/3/17									
21		Armado de Estructura	5.37 días	mar 7/3/17	mié 15/3/17									
22		Tendido de Conductores	7.45 días	mié 15/3/17	vie 24/3/17									
23		Montaje de Transformadores	5.37 días	vie 24/3/17	lun 3/4/17									
24		Instalación de Luminarias	5.37 días	lun 3/4/17	lun 10/4/17									
25		Correcciones	1.34 días	lun 10/4/17	mar 11/4/17									
26		Remociones	2.68 días	mar 11/4/17	vie 14/4/17									
27		Normalización de Suministros	14.69 días	vie 14/4/17	vie 5/5/17									
28		Evaluación	0 días	vie 5/5/17	vie 5/5/17									
29		Etapa 3	51.21 días	mié 5/4/17	jue 15/6/17									
30		Izaje de Postes	8.94 días	mié 5/4/17	lun 17/4/17									
31		Armado de Estructura	5.37 días	lun 17/4/17	mar 25/4/17									
32		Tendido de Conductor	7.45 días	mar 25/4/17	jue 4/5/17									

Proyecto: Cronograma Modelo NI
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	7 ago '16			25 sep '16			13 nov '16		
						V	D	M	J	S	L	X		
33		Montaje de Transformadores	5.37 días	jue 4/5/17	vie 12/5/17									
34		Instalación de Luminarias	5.37 días	vie 12/5/17	vie 19/5/17									
35		Correcciones	1.34 días	vie 19/5/17	lun 22/5/17									
36		Remociones	2.68 días	lun 22/5/17	jue 25/5/17									
37		Normalización de Suministros	14.69 días	jue 25/5/17	jue 15/6/17									
38		Evaluación	0 días	jue 15/6/17	jue 15/6/17									
39		Etapas 4	51.21 días	lun 15/5/17	mar 25/7/17									
40		Izaje de Postes	10 días	lun 15/5/17	vie 26/5/17									
41		Armado de Estructur	5.37 días	lun 29/5/17	lun 5/6/17									
42		Tendido de Conductor	7.45 días	lun 5/6/17	mié 14/6/17									
43		Montaje de Transformadores	5.37 días	mié 14/6/17	jue 22/6/17									
44		Instalación de Luminarias	5.37 días	jue 22/6/17	jue 29/6/17									
45		Correcciones	1.34 días	jue 29/6/17	vie 30/6/17									
46		Remociones	2.68 días	vie 30/6/17	mié 5/7/17									


Proyecto: Cronograma Modelo NI
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	7 ago '16			25 sep '16			13 nov '16	
						V	D	M	J	S	L	X	
47		Normalización de Suministros	14.69 días	mié 5/7/17	mié 26/7/17								
48		Evaluación	0 días	mié 26/7/17	mié 26/7/17								
49		Cierres Técnico y Administrativo	46 días	mar 25/7/17	mar 26/9/17								
50		Cierre Técnico	28 días	mar 25/7/17	jue 31/8/17								
51		Cierre Administrativo	22 días	vie 1/9/17	lun 2/10/17								
52		Evaluación	0 días	lun 2/10/17	lun 2/10/17								


Proyecto: Cronograma Modelo NI
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

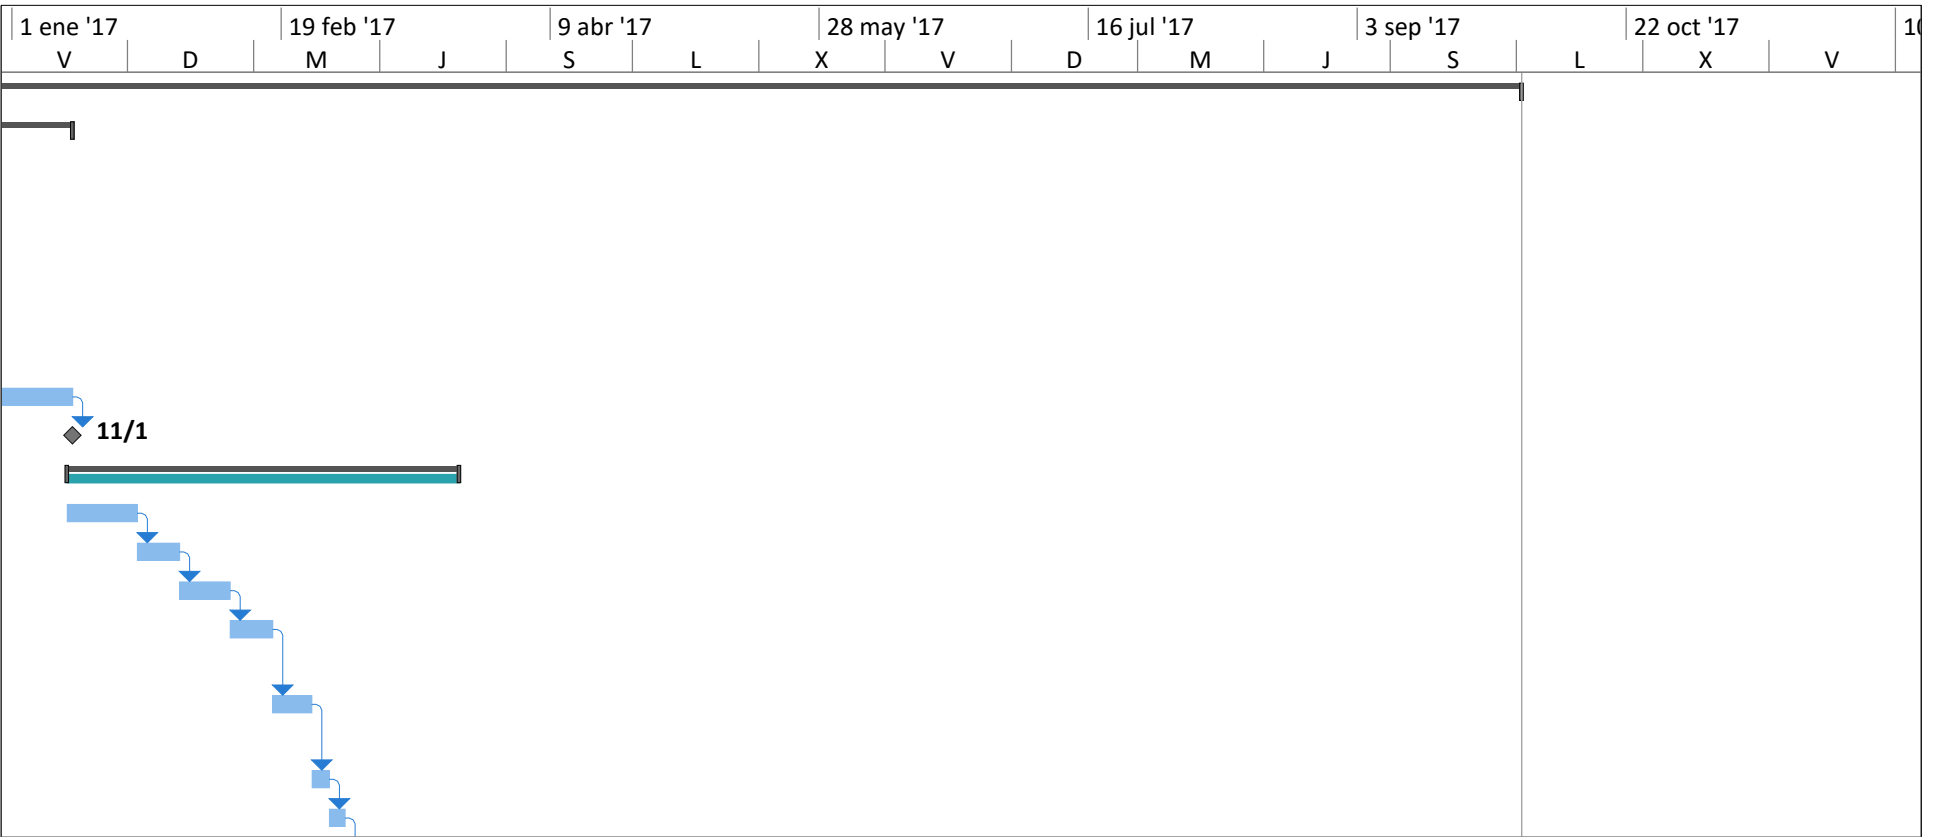


Proyecto: Cronograma Modelo NI
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

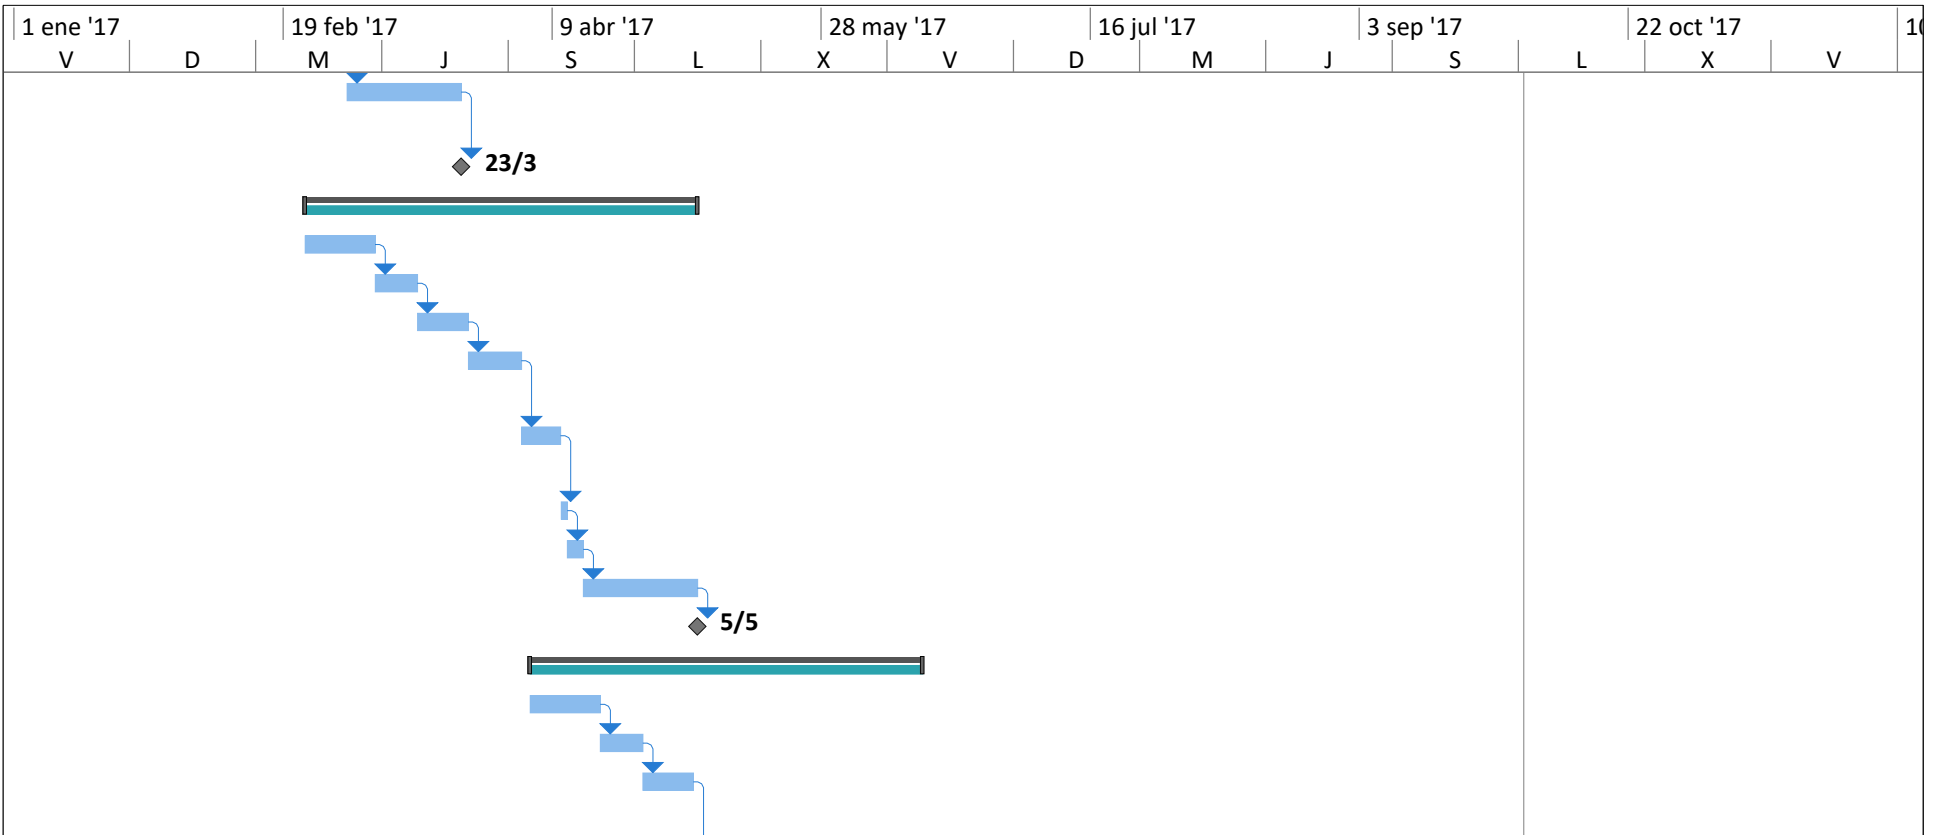


Proyecto: Cronograma Modelo NI
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

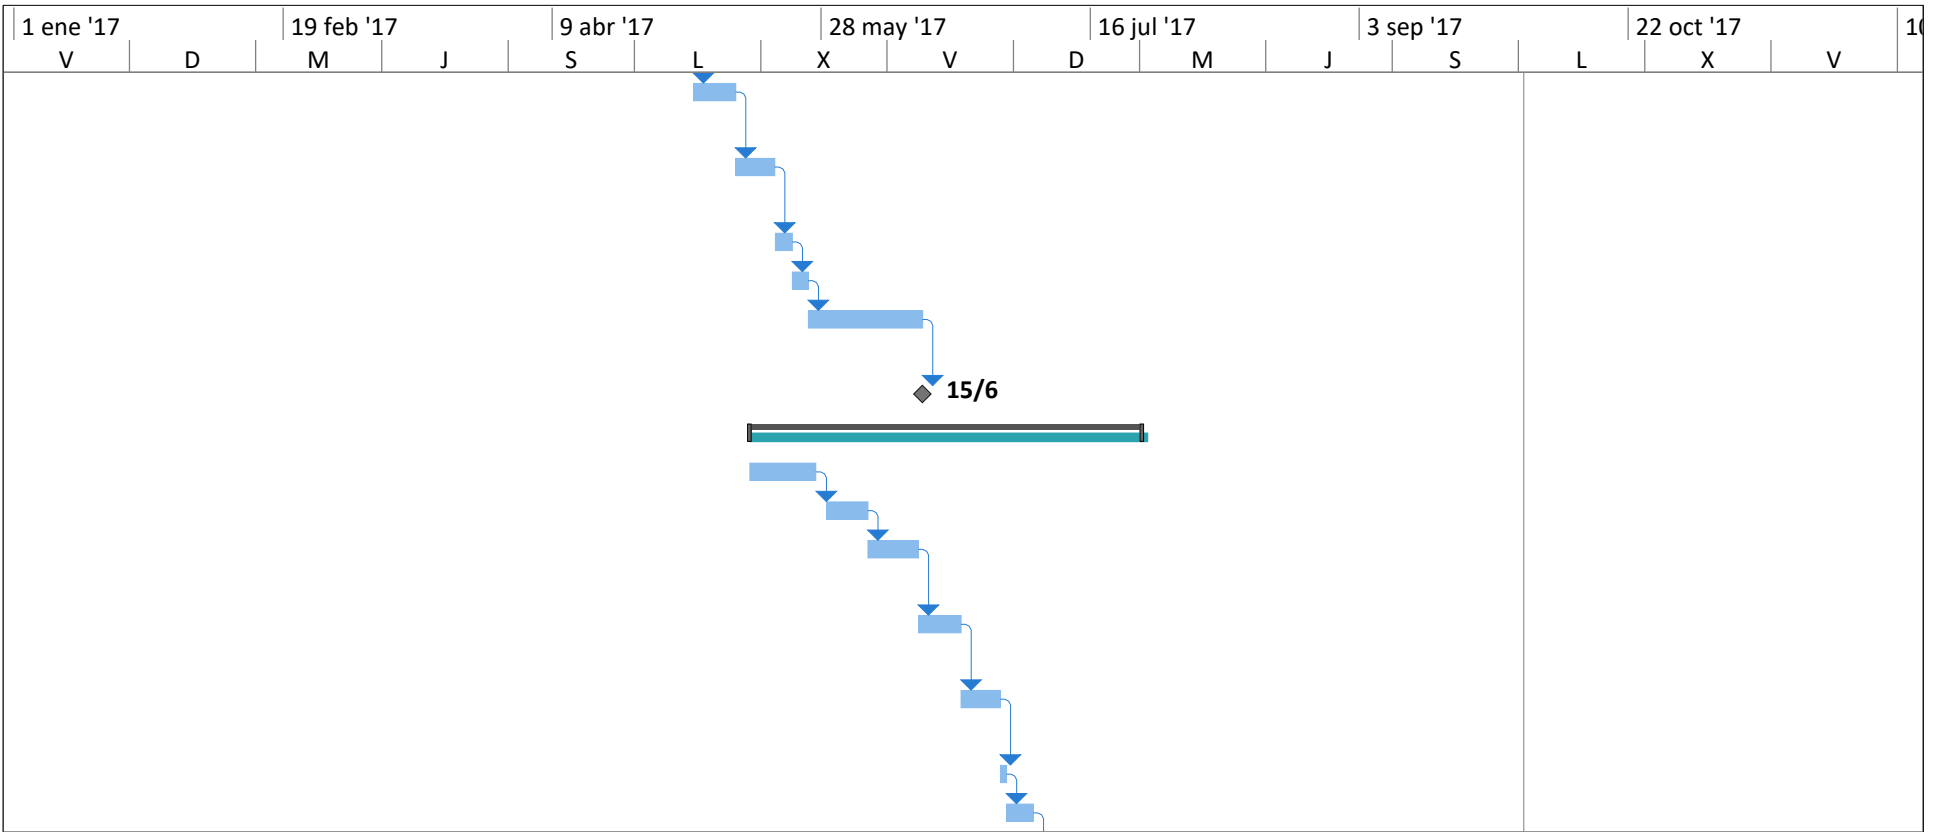

Proyecto: Cronograma Modelo NI
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

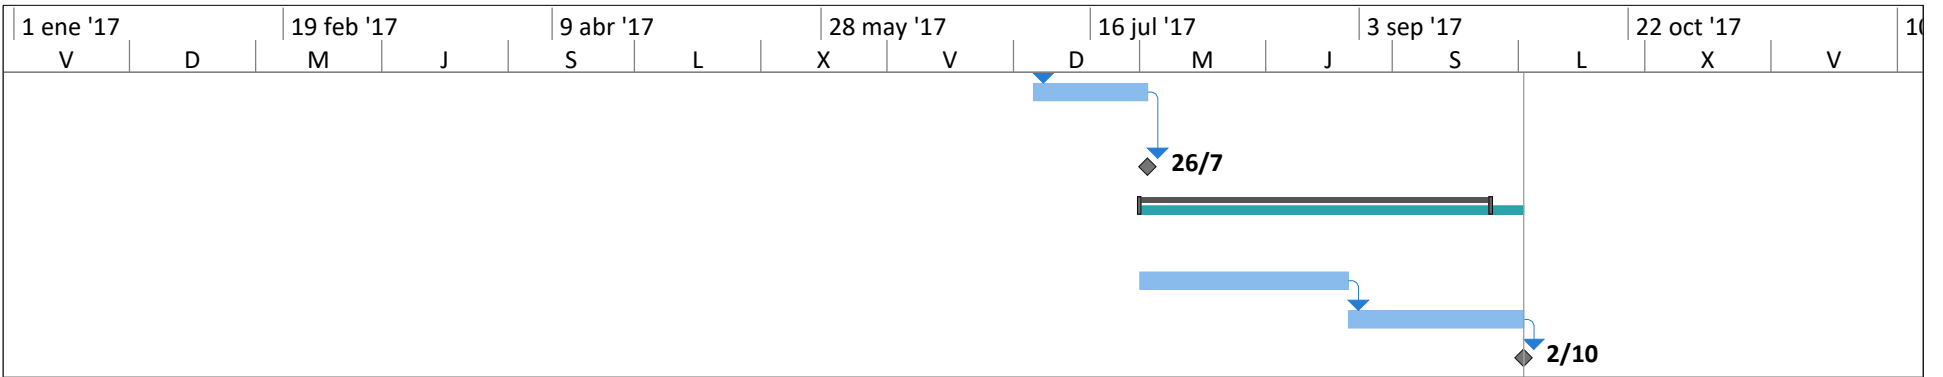

Proyecto: Cronograma Modelo NI
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			
