

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	7 ago '16		25 sep '16			13 nov '16	
						V	D	M	J	S	L	X
1		<b>Circuito NIBA112</b>	<b>277 días</b>	<b>vie 9/9/16</b>	<b>lun 2/10/17</b>							
2		<b>Adquisiciones</b>	<b>89 días</b>	<b>vie 9/9/16</b>	<b>mié 11/1/17</b>							
3		Postes	56 días	vie 9/9/16	vie 25/11/16							
4		Herrajes y Conectores	66 días	vie 9/9/16	vie 9/12/16							
5		Conductores MT/BT/Acometidas	71 días	vie 9/9/16	vie 16/12/16							
6		Transformadores y Eq. Protección	76 días	vie 9/9/16	vie 23/12/16							
7		Equipos de Medición	89 días	vie 9/9/16	mié 11/1/17							
8		Evaluación	0 días	mié 11/1/17	mié 11/1/17							
9		<b>Etapa 1</b>	<b>51.21 días</b>	<b>mié 11/1/17</b>	<b>jue 23/3/17</b>							
10		Izaje de Postes	8.94 días	mié 11/1/17	lun 23/1/17							
11		Armado de Estructuras	5.37 días	lun 23/1/17	mar 31/1/17							
12		Tendido de Conductores	7.45 días	mar 31/1/17	jue 9/2/17							
13		Montaje de Transformadores	5.37 días	jue 9/2/17	vie 17/2/17							
14		Instalación de Luminarias	5.37 días	vie 17/2/17	vie 24/2/17							
15		Correcciones	1.34 días	vie 24/2/17	lun 27/2/17							
16		Remociones	2.68 días	lun 27/2/17	jue 2/3/17							

Proyecto: Cronograma Modelo NI  
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	7 ago '16			25 sep '16			13 nov '16		
						V	D	M	J	S	L	X		
17		Normalización de Suministros	14.69 días	jue 2/3/17	jue 23/3/17									
18		Evaluación	0 días	jue 23/3/17	jue 23/3/17									
19		<b>Etapa 2</b>	<b>51.21 días</b>	<b>mar 28/2/17</b>	<b>mié 10/5/17</b>									
20		Izaje de Postes	8.94 días	mar 28/2/17	vie 10/3/17									
21		Armado de Estructur	5.37 días	vie 10/3/17	lun 20/3/17									
22		Tendido de Conducto	7.45 días	lun 20/3/17	mié 29/3/17									
23		Montaje de Transformadores	5.37 días	mié 29/3/17	jue 6/4/17									
24		Instalación de Luminarias	5.37 días	jue 6/4/17	jue 13/4/17									
25		Correcciones	1.34 días	jue 13/4/17	vie 14/4/17									
26		Remociones	2.68 días	vie 14/4/17	mié 19/4/17									
27		Normalización de Su	14.69 días	mié 19/4/17	mié 10/5/17									
28		Evaluación	0 días	mié 10/5/17	mié 10/5/17									
29		<b>Etapa 3</b>	<b>51.21 días</b>	<b>mié 10/5/17</b>	<b>jue 20/7/17</b>									
30		Izaje de Postes	8.94 días	mié 10/5/17	lun 22/5/17									
31		Armado de Estructur	5.37 días	lun 22/5/17	mar 30/5/17									
32		Tendido de Conductor	7.45 días	mar 30/5/17	jue 8/6/17									


Proyecto: Cronograma Modelo NI  
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	7 ago '16			25 sep '16			13 nov '16	
						V	D	M	J	S	L	X	
33		Montaje de Transformadores	5.37 días	jue 8/6/17	vie 16/6/17								
34		Instalación de Luminarias	5.37 días	vie 16/6/17	vie 23/6/17								
35		Correcciones	1.34 días	vie 23/6/17	lun 26/6/17								
36		Remociones	2.68 días	lun 26/6/17	jue 29/6/17								
37		Normalización de Suministros	14.69 días	jue 29/6/17	jue 20/7/17								
38		Evaluación	0 días	jue 20/7/17	jue 20/7/17								
39		<b>Cierres Técnico y Administrativo</b>	<b>46 días</b>	<b>lun 31/7/17</b>	<b>lun 2/10/17</b>								
40		Cierre Técnico	24 días	lun 31/7/17	jue 31/8/17								
41		Cierre Administrativo	22 días	vie 1/9/17	lun 2/10/17								
42		Evaluación	0 días	lun 2/10/17	lun 2/10/17								

Proyecto: Cronograma Modelo NI  
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

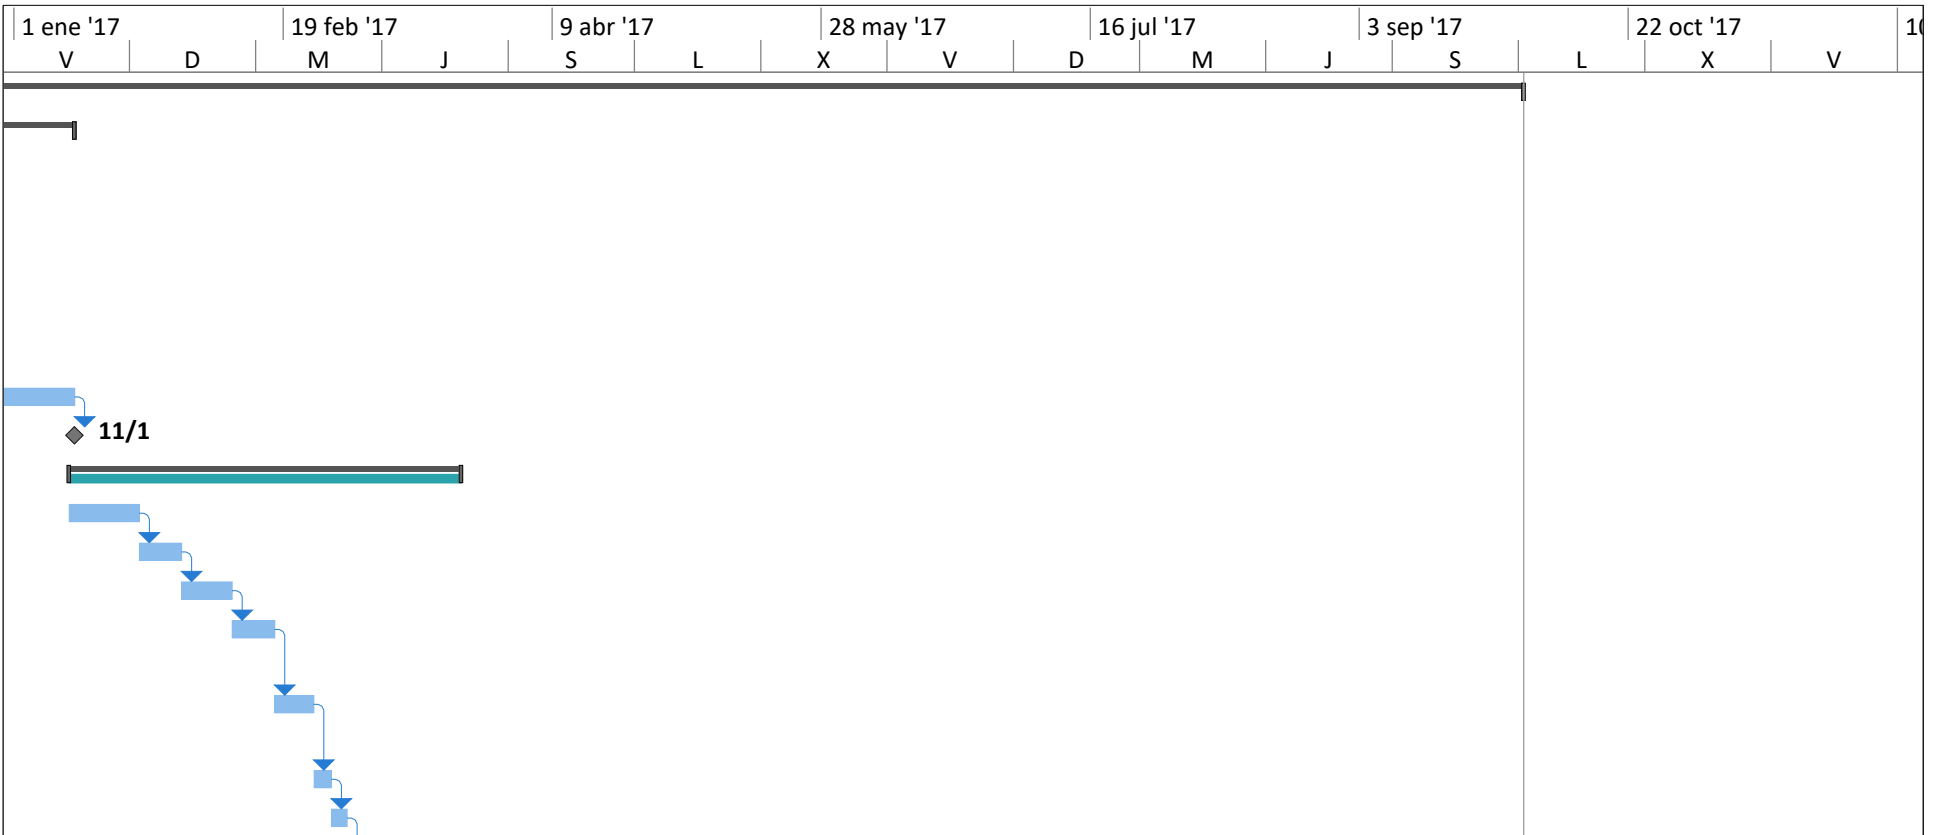


Proyecto: Cronograma Modelo NI Fecha: mar 19/12/17	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			

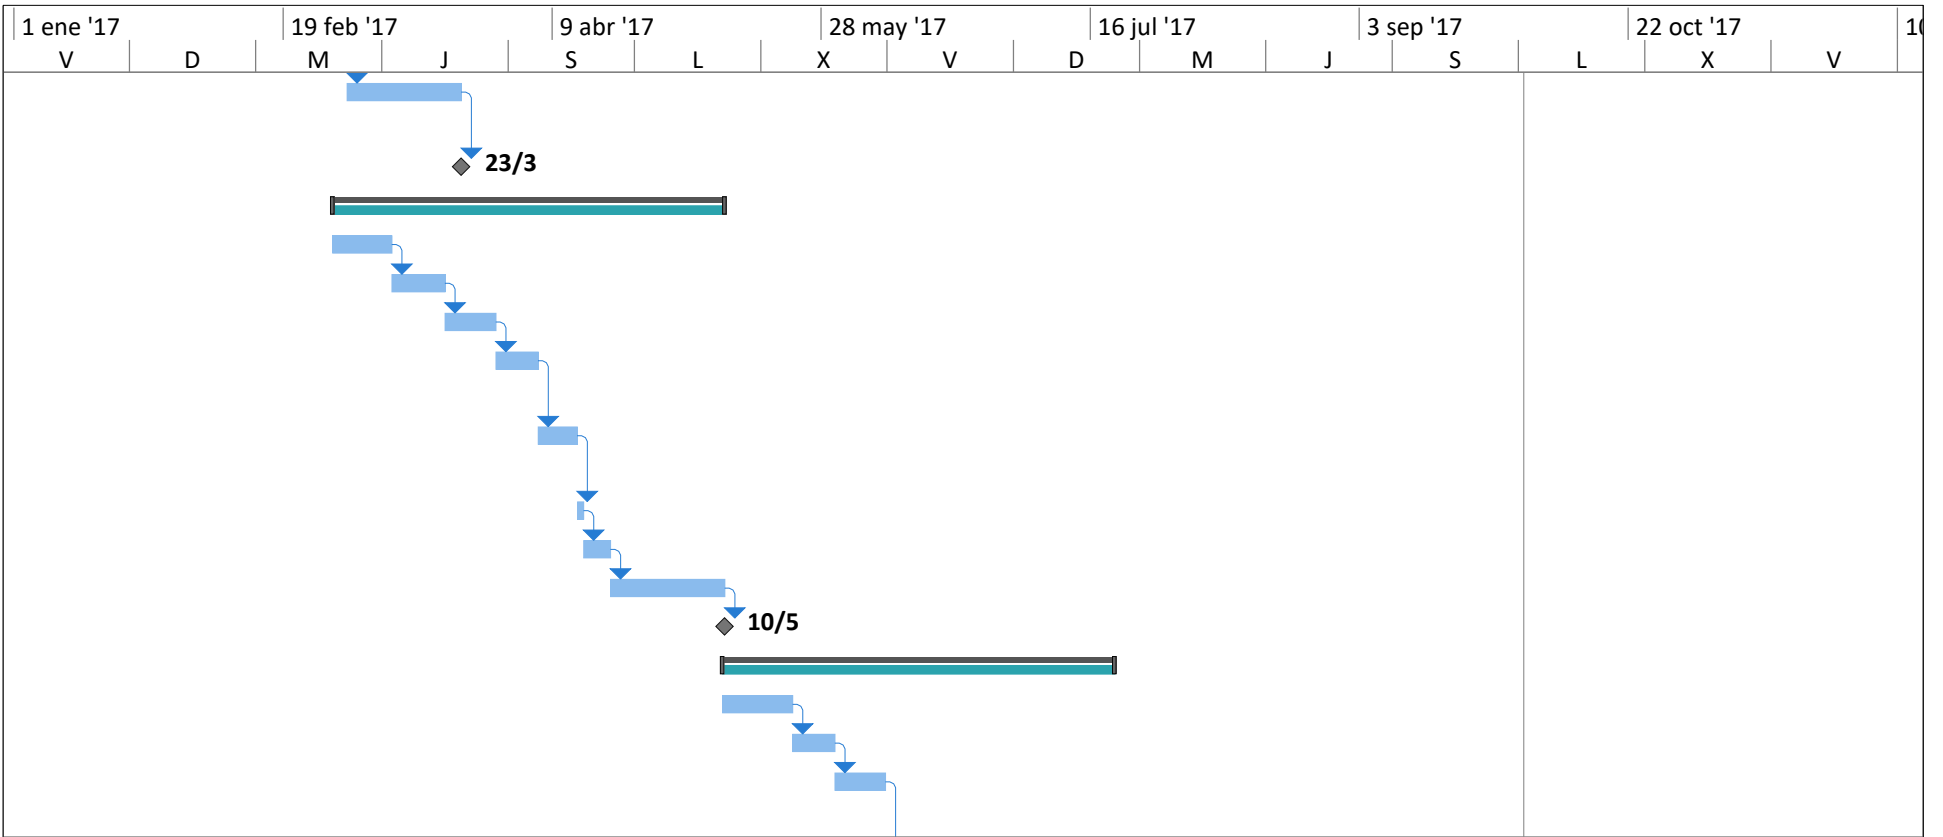

Proyecto: Cronograma Modelo NI  
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

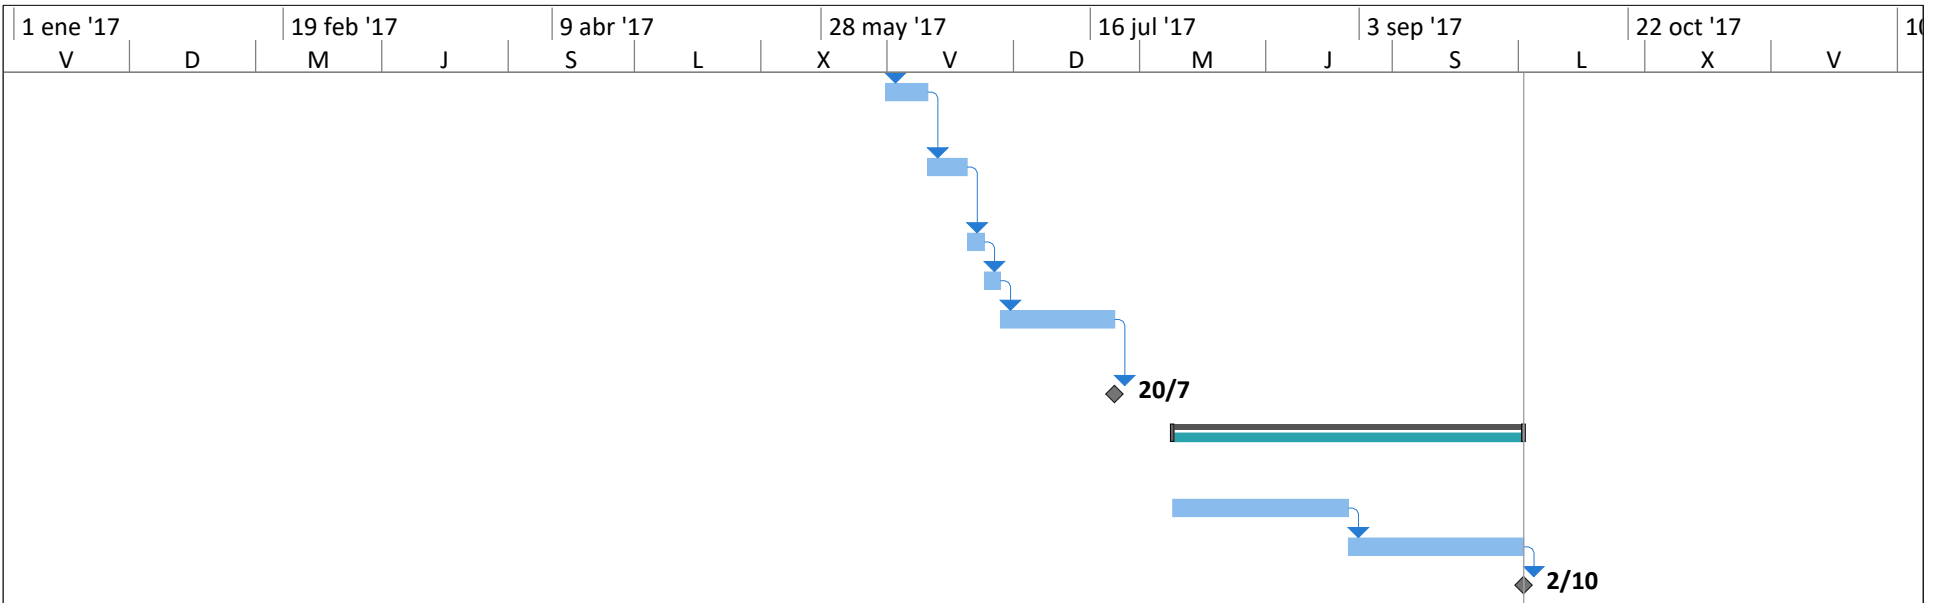

Proyecto: Cronograma Modelo NI  
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			
